Education and Culture
TEMPUS

Strengthening Public Administration and Media in Georgia

SPAMGO

პროექტის მენეჯმენტი

ზურაბ ჯაფარიძე, გიორგი ჯაფარიძე,
თებრონე გომელაური

თბილისი 2007

The University of Nottingham
adelphi research

საავტორო უფლება

წინამდებარე პუბლიკაციაში შესული მასალა სხვადასხვა ავტორის ან ორგანიზაციის საკუთრებაა. უმეტეს შემთხვევაში, მასალა უფასოდ არის განთავსებული ინტერნეტში, მითითებულია რა ავტორის ვინაობა. მათი გამოყენება ნებადართულია ღია რესურსების არამომგებიანი ან/და შესაძლებლობების განვითარების მიზნებით. მასალის კომპაქტ-დისკით გამრავლება არ ეწინააღმდეგება საავტორო უფლებების პრინციპებს. ეფუძნება რა ღია (უფასო) რესურსების არამომგებიანი მიზნებით გამოყენების კონცეფციას, წინამდებარე პუბლიკაცია უტოვებს ყველა საავტორო უფლებას ავტორებს ან შესაბამის ორგანიზაციებს.

მასალის გამოყენებისას მითითებული უნდა იქნას ავტორის, წყაროს და საავტორო უფლების მფლობელის ვინაობა.

ეს პუბლიკაცია მომზადდა პროექტი სპამგოს (SPAMGO – Strengthening Public Administration and Media in Georiga) მიერ ევროკომისიის ტემპუსის პროგრამის ფინანსური მხარდაჭერის ფარგლებში. პუბლიკაციში მოყვანილი შეხედულებები შესაძლოა არ ასახავდნენ ევროკომისიის ოფიციალურ თვალსაზრისს.

სარჩევი

შესავალი 5
2 შესავალი პროექტის მენეჯმენტში 6
2.1 პროექტი 6
2.2 პროექტი, პროგრამა, პორტფოლიო 6
2.3 პროექტი და რუტინა (ყოველდღიური საქმიანობა) 6
2.4 რა არის პროექტის მენეჯმენტი? 7
2.5 პროექტის ციკლი 8
2.6 პროექტის ინიცირების განმაპირობებელი ფაქტორები 10
3 პროექტის იდენტიფიკაცია 10
3.1 რა არის საჭიროება? 10
3.2 მონაწილეთა ანალიზის მატრიცა 11
3.3 ინტერვიუ 12
3.3.1 როდის დავსვათ ღია ტიპის კითხვები 12
3.3.2 როდის დავსვათ დახურული ტიპის კითხვები 12
3.3.3 როდის დავსვათ ჰიპოთეტური კითხვები 13
3.4 ინტერვიუს კითხვების შემუშავების სტრატეგიები 13
3.5 შეხვედრები, შეხვედრების განრიგი 13
3.6 მეორეხარისხოვანი ინფრომაციის მოპოვება 14
3.6.1 მეორეხარისხოვანი ინფორმაციის ტიპები 15
4. პროექტის ხედვა 15
4.1 პრობლემის ანალიზი და პრობლემის ხე 16
4.2 მრავალმხრივი მიდგომის პრინციპი 16
5 პრიორიტეტების დასახვა 20
5.1 გეგმის დასახვა/მიზნების დასახვა 20
5.2 შედეგების განსაზღვრა 22
6 რისკები 23
6.1 რისკის მენეჯმენტი 23
6.2 როგორ განვსაზღვროთ პოტენციური რისკები 24
6.3 ალბათობა-გავლენის მატრიცა 24
6.4 რისკების მენეჯმენტის სტრატეგია 25
7 ლოგიკური ჩარჩოს მიდგომა და ლოგიკური მატრიცა 25
7.1 ლოგიკური მატრიცა 25
7.1.1 ლოგიკური ჩარჩოს მატრიცის დასრულება 26
7.1.2 საერთო მიზანი 27
7.1.3 პროექტის მიზანი 27
7.1.4 პროექტის შედეგები 27
7.1.5 პროექტის ღონისძიებები 28
7.2 პროექტის წარმატების შემოწმების კრიტერიუმის არჩევა 28
7.3. შემოწმების საშუალებების განსაზღვრა 29
7.4 მნიშვნელოვანი ვარაუდების და წინაპირობების ჩამოყალიბება 30
7.4.1 მნიშვნელოვანი ვარაუდები 30
7.5 წინაპირობები 31
7.6 პროექტის დიზაინის დამტკიცება/გადამოწმება 32

8 ღონისძიებების გეგმის შემუშავება 37
8.1 სამუშაოს დანაწილების სტრუქტურა 37
8.2 რესურსები 38
9 ბიუჯეტი 38
9.1 ფინანსური წყაროები 38
10 პიროვნული დროის მენეჯმენტი 39
11 კრიტიკული გზა და პერტი (PERT) 40
11.1 კრიტიკული გზის მეთოდი 40
11.2 პერტი 41
12 გუნდის ფორმირება 42
13 ტექნიკური დავალება (Terms of Reference) 43
14 შესყიდვების მენეჯმენტი 46
15 ხარისხის მენეჯმენტი 47
15.1 ხარისხის მენეჯმენტის ხერხები 48
15.1.1 ბენჩმარკინგი 48
15.2 ხარისხის უზრუნველყოფის ხერხები 48
15.2.1 ხარისხის დაგეგმვის ხერხები 48
15.2.2 ხარისხის რეგულარული აუდიტი 48
15.3 პროცესების ანალიზი 48
15.4 ხარისხის კონტროლის ხერხები 48
15.4.1 მიზეზ-შედეგობრივი დიაგრამა 48
15.4.2 ინსპექტირება 49
15.4.3 სტატისტიკური შერჩევა 49
16 პროექტის ხარჯების მენეჯმენტი 49
17 ცვლილებების მენეჯმენტი 50
17.1 ცვლილებების მენეჯმენტი ხერხები 50
17.1.1 პროექტის მენეჯმენტის საინფორმაციო სისტემები 50
17.1.2 ექპერტთა შეფასებები 50
17.1.3 საჭირო საბუთები 50
17. 2 ცვლილებების გატარების მენეჯმენტი 51
18 მონიტორინგი და კონტროლი 51
18.1 რა ინფორმაცია არის საჭირო მონიტორინგის და კონტროლისთვის? 51
18.2 ინფორმაციის შეგროვების გზები 52
18.3 კითხვები, რომელებიც უნდა დაისვას შეხვედრების დროს 52
18.4 მონიტორინგის იარაღი – მონიტორინგის მატრიცა (მოვალეობების მატრიცა) 53
18.5 მონიტორინგის იარაღი – ცხრილი (განტის პროგრესის დიაგრამა) 53
19 რეპორტი 54
19.1 რეპორტების ტიპები: 54
20 პროექტის დასრულება და შეფასება 55
20.1 რჩევები პროექტის დასრულებისთვის: 55
20.2 პროექტის დასრულების გამოცხადების მნიშვნელობა: 55
20.3 პროექტის დიზაინის შეფასება 55
20.4 პროექტის შედეგების შეფასება 56
20.5 იმის განსაზღვრა, თუ რა ვისწავლეთ 56
21 გამოყენებული ლიტერატურა 57
22. გამოყენებული ინტერნეტ-რესურსები: 57

შესავალი

წინამდებარე სახელმძღვანელოს შექმნისას ჩვენი მიზანი იყო ის, რომ დაინტერესებული ადამიანებისათვის მიგვეწოდებინა პროექტის მენეჯმენტის პროცესის გამარტივებული აღწერა. სახელმძღვანელოში ყურადღება გამახვილებულია პროექტის იდეების გენერირების, იდეების განვითარებისა და პროექტის უშუალო განხორციელების საკითხებზე. წარმატებული პროექტის მენეჯერის მიზნებს საკუთარი ორგანიზაციისთვის პროექტის მნიშვნელობის გაცნობიერება და პროექტის დასაწყისიდან დასრულებამდე ეფექტური ხელმძღვანელობისთვის აუცილებელი ინსტრუმენტების, ტექნიკის და პიროვნული უნარების დახვეწა წარმოადგენს.

ორგანიზაციები სულ უფრო მზარდ ინტერესს ავლენენ პროექტების მნიშვნელობის მიმართ. პროექტი ორგანიზაციების სტრატეგიული მიზნების მიღწევის უმთავრესი იარაღი ხდება. საქართველოში, სადაც სამოქალაქო საზოგადოება განვითარების ჯერ კიდევ საწყის საფეხურზეა, საზოგადოებრივი პროექტების გამოცდილ მენეჯერებს მნიშვნელოვანი წვლილის შეტანა შეუძლიათ სხვადასხვა სექტორში ვითარების გაუმჯობესების საკითხებში.

წინამდებარე სახლემძღვანელო ფართო აუდიტორისთვის არის განკუთვნილი. თუმცა, იგი მაინც საზოგადოებრივ სექტორთან დაკავშირებულ პროექტებზე ფოკუსირდება. სახელმძღვანელო მოიცავს მენეჯერისთვის აუცილებელ იმ უნარების და ცოდნის აღწერას, რაც პროექტის ინიცირების, დაგეგმვის, ბიუჯეტირების, განხორციელების და წარმატებული დასრულებისთვის არის საჭირო. სახელმძღვანელო ძალიან გამოადგებათ როგორც უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებს და წარმატებულ პროექტის მენეჯერებს, ასევე საჯარო სექტორის მაღალჩინოსნებს პროექტის მენეჯმენტის ციკლის და ეფექტური მენეჯმენტისთვის საჭირო უნარების გაცნობიერების საკითხებში. დაინტერესებული მკითხველები აღმოაჩენენ პროექტის მსგავსი საქმიანობისთვის საჭირო სხვადასხვა ტექნიკის და მიდგომის საკმაოდ დეტალურ მაგალითებს. პრაქტიკოსი პროექტის მენეჯერებისთვის სახელმძღვანელო იქნება ეფექტური გზამკვლევი პროექტის მენეჯმენტის თანმდევი ტიპიური პრობლემების მოგვარების პროცესში. სახელმძღვანელოში სიღრმისეულად არის აღწერილი პროექტის მენეჯმენტის ყველაზე კრიტიკული საკითხები: პროექტის ხედვა, მონაწილეთა ანალიზი, პრობლემის ანალიზი, მიზნების დასახვა, ლოგიკური ჩარჩოს მატრიცა, მონიტორინგი და შეფასება, ბიუჯეტი და ა.შ.

სახელმძღვანელოში მოყვანილ მიდგომებს, პრინციპებს და ტექნიკის მაგალითების გააჩნიათ უნივერსალური გამოყენება. სახელმძღვანელო არამცთუ არ არის განკუთვნილი სპეციფიური ტიპის პროექტებისთვის, არამედ შედგენენილია სწორედ იმ ტიპის ადამინებისთვის, რომლებსაც უხდებათ მრავალფეროვანი პროექტების მართვა და განხვავებული ორგანიზაციული სტრუქტურის მქონე კომპანიებში მუშაობა.

2 შესავალი პროექტის მენეჯმენტში

2.1 პროექტი

პროექტი არის ერთმანეთთან დაკავშირებული ღონისძიებების სერია და მისი დანიშნულებაა წინასწარდასახული მიზნის ან მიზნების მიღწევა მკაცრად განსაზღვრული დროისა და რესურსების პირობებში ხარისხის ყველა ინდიკატორის დაცვის გათვალიწინებით.
პროექტის მთავარი ელემენტებია:

- ის ეხება სპეციფიურ საჭიროებას (მოთხოვნილებას), რომელიც განისაზღვრა არსებული მდგომარეობის ზედმიწევნით შესწავლის შედეგად;
- ყველა საჭირო ღონისძიება არის ყურადღებით მოფიქრებული და განხორციელებული დეტალური გეგმის მიხედვით;
- გეგმა მოიცავს აქტივობების ან დავალებების სერიას, რომელსაც გარკვეულ შედეგამდე მივყავართ. გეგმას აქვს მკაცრად განსაზღვრული დაწყების და დასრულების თარიღები. სასურველი შედეგი არის მკაფიოდ განსაზღვრული ხარისხის და რაოდენობის მხრივ.
- ადამიანთა ჯგუფი, მასალა და ფინანსები არის გამონახული თითოეული აქტივობის განსახორციელებლად.

> პროექტი არის დროებითი ღონისძიება, რომლის მიზანია ახალი პროდუქტის ან მომსახურების შექმნა ან გარკვეული შედეგის მიღება.

2.2 პროექტი, პროგრამა, პორტფოლიო

პროგრამა არის თემატურად ურთიერთდაკავშირებული პროექტების ერთობლიობა, რომელიც იმართება კოორდინირებულად იმ სასურველი შედეგის მისაღებად, რომლის მიღება შეუძლებელი ან პრობლემატური იქნებოდა ცალკეული პროექტის ინდივიდუალური მართვის პირობებში
პროგრამები შეიძლება მოიცავდეს ცალკეული პროექტების ჩარჩოების გარეთ არსებული სამუშაოს ელემენტებს. მაგალითად:

- ახალი მოდელის ავტომანქანის პროგრამა შეიძლება დაიყოს დიზაინის და თითოეული მთავარი კომპონენტის განახლების პროექტებად (მაგ: ტრანსმისია, ძრავა, შიდა და გარე ნაწილები), მაშინ როცა წარმოების პროცესი აწყობას უშუალოდ აწყობისას ხორციელდება;
- ბევრ ელექტრონულ ფირმას ჰყავს პროგრამის მენეჯერები ვინც პასუხისმგებელნი არიან როგორც ინდივიდუალური პროდუქტის გამოშვებაზე (პროექტებზე), ასევე გარკვეული დროის განმავლობაში მრავალი სხვა გამოშვების კოორდინაციაზე (მიმდინარე ოპერაცია).

პორტფოლიო არის პროექტების, პროგრამების და მათთან დაკავშირებული სხვა საქმიანობების ერთობლიობა და მისი დანიშნულებაა მენეჯმენტის ეფექტურობის ამაღლება და ბიზნესის სტრატეგიული მოთხოვნების უკეთ დაკმაყოფილებისთვის ხელის შეწყობა

2.3 პროექტი და რუტინა (ყოველდღიური საქმიანობა)

ორგანიზაციები ასრულებენ სამუშაოს მიზნების მისაღწევად. ზოგადად, სამუშაო შეიძლება განმარტებული იქნას როგორც პროექტი ან რუტინა (ყოველდღიური საქმიანობა), თუმცა,

პროექტი და ყოველდღიური საქმიანობა ხშირად ფარავს ერთმანეთს. მათ ბევრი საერთო თვისება აქვთ:

- სრულდებიან ადამიანების მიერ
- გააჩნიათ შეზღუდული რესურსები
- ორივე არის დაგეგმილი, შესრულებული და გაკონტროლებული.

პროექტი და რუტინა ძირითადად განსხვავდება იმით, რომ რუტინა არის მიმდინარე (მუდმივი) და განმეორებადი, მაშინ როცა პროექტი არის დროებითი და უნიკალური. პროექტის და რუტინის მიზნებიც ფუნდამენტურად განსხვავებულია. პროექტის მიზანი არის მის დასრულებამდე მიზნის მიღწევა (შედეგის მიღება), მაშინ როცა რუტინის მიზანია საქმიანობის შენარჩუნება. პროექტი მთავრდება მაშინ, როდესაც მიზანი მიღწეულია, ხოლო რუტინული საქმიანობა ირჩევს (ისახავს) სხვა (ახალ) მიზნებს და სამუშაო გრძელდება.
პროექტები ხორციელდება ორგანიზაციის ნებისმიერ საფეხურზე და შეიძლება მოიცავდეს ერთ ან ათასობით ადამიანს. პროექტის ხანგრძლივობა მერყეობს რამოდენიმე კვირიდან რამოდენიმე წლამდე. პროექტები შეიძლება მოიცავდნენ ორგანიზაციის ერთ ან რამოდენიმე განყოფილებას. პროექტის მაგალითები:

- ახალი პროდუქციის შექმნა
- ორგანიზაციაში სტრუქტურის, თანამშრომლების ან სტილის შეცვლის განხორციელება
- ახალი სატრანსპორტო საშუალების შექმნა
- ახალი ან შეცვლილი საინფორმაციო სიტემის შექმნა ან არსებულის განვითარება (გაუმჯობესება)
- შენობის ან ნაგებობის კონსტრუირება (აგება)
- წყლის სისტემის აშენება დასახლებისთვის
- პოლიტიკური პარტიისთვის კამპანიის გამართვა
- ახალი ბიზნეს პროცედურის ან პროცესის განხორციელება (ჩატარება)
- ტენდერში მოგებული საქმიანობის განხორციელება

2.4 რა არის პროექტის მენეჯმენტი?

პროექტის მენეჯმენტი არის კონცეფციების, ხერხების, ინსტრუმენტების და პრაქტიკული გამოცდილების ერთობლიობა, რაც საშუალებას აძლევს პროექტის მენეჯერს ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მეშვეობით მართოს პროექტი და მისი ცალკეული ფაზები.
პროექტის მენეჯერი არის პასუხისმგებელი პროექტის ამოცანების შესრულებაზე.
პროექტის მენეჯმენტი (მართვა) მოიცავს:

- მოთხოვნილებების განსაზღვრას
- ნათელი და მიღწევადი მიზნების დასახვას
- ხარისხის, შინაარსობრივი მხარის, დროის და ხარჯების მოთხოვნების ბალანსირებას
- სხვადასხვა დაინტერესებული მხარის მოლოდინებზე და ინტერესებზე გეგმის და მიდგომის მორგებას.

> პროექტის მენეჯმენტი არის ცოდნის, უნარების, იარაღების და ტექნიკის გამოყენება პროექტის აქტივობებისთვის პროექტის მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებისთვის

პროექტის კონკურენტული მოთხოვნილებების მართვისას პროექტის მენეჯერები ხშირად საუბრობენ ე.წ. „სამმაგ წნეხზე“ – პროექტის ჩარჩოები, დრო და ხარჯები. პროექტის ხარისხზე გავლენას ახდენს ეს სამი ფაქტორის ბალანსირება. წარმატებული პროექტები

ნერგავენ ახალ პროდუქტს, მომსახურებას ან იძლევიან კონკრეტულ შედეგს დროის, ბიუჯეტში და ჩარჩოების მოთხოვნების დაცვის პირობებში. ამ ფაქტორებს შორის ურთიერთობა ისეა აწყობილი, რომ, თუ ერთი მათგანი იცვლება, მინიმუმ დანარჩენ ერთზე მაინც მოქმედებს ეს ცვლილება. პროექტის ამ სამი ფაქტორის გათვალისწინებით ხდება პროექტების მართვა რისკის ან გაუთვალისწინებელი მოვლენების საპასუხოდ. რისკი არის გაუთვალისწინებელი მოვლენა ან მდგომარეობა, რომელსაც შეიძლება ქონდეს პოზიტიური ან ნეგატიური გავლენა პროექტის სულ მცირე ერთ მიზანზე. პროექტის მენეჯმენტის გუნდს დაკისრებული აქვს პროფესიული პასუხისმგებლობა დაინტერესებული მხარეების, მომხმარებლის, შემსრულებელი ორგანიზაციის და ხალხის მიმართ.

2.5 პროექტის ციკლი

მართვის და კონტროლის უფრო რფექტურად განხორცოელების მიზნით პროექტის მენეჯერებს ან პროექტის განმახორციელებელ ორგანიზაციებს შეუძლიათ დაყონ პროექტები ცალკეულ ფაზებად. ერთად აღებულ ამ ფაზებს პროექტის ციკლს უწოდებენ. ბევრი ორგანიზაცია წინასწარ განსაზღვრავს პროექტის ციკლის შემადგენელ ფაზებს და იყენებს მათ ყველა პროექტში, რომელსაც ახორციელებს.

პროექტის ციკლის მახასიათებლები
პროექტის ციკლი განსაზღვრავს ფაზებს, რომლებიც აკავშირებენ პროექტის დასაწყისს მის დასრულებასთან. მაგალითად, როცა ორგანიზაცია განსაზღვრავს პროექტის განხორციელების შესაძლებლობას, ჯერ ხდება ამ შესაძლებლობის განხორციელებადობის შესწავლა (Feasibility Study) და შემდგომ ხდება პროექტის განხორციელების ან განუხორციელებლობის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება.
პროექტის ციკლის განსაზღვრების დახმარებით პროექტის მენეჯერს შეუძლია გადაწყვიტოს შესაძლებლობის განხორციელებადობა შესწავლა განახორციელოს როგორც ერთი, ცალკეული პროექტი თუ ჩართოს ეს ღონისძიება უფრო ფართომასშტაბიან პროექტში პირველ ფაზად. პირველი მცდელობის შედეგი არ არის ზუსტად განსაზღვრებადი, ასეთი მცდელობები შეგვიძლია როგორც დამოუკიდებელი პროექტი ისე განვსაზღვროთ.
პროექტის ციკლის ერთი ფაზიდან მეორეში გადასვლა ჩვეულებრივ განისაზღვრება ტექნიკური ცვლილებითაც. თითოეული ფაზის დასრულების შემდეგ ხდება იმის შეფასება, თუ რამდენად ზუსტად და დეტალურად განხორციელდა ეს ფაზა და მხოლოდ ამის შემდეგ ხდება მომდევნო ფაზაზე გადასვლა. თუმცა, იმ შეთხვევაში თუ არ არის მოსალოდნელი ზედმეტად ნეგატიური რიკები, ასევე შესაძლებელია შემდგომი ფაზის განხორციელების დაწყება, მანამ სანამ შეფასდება წინა ფაზის შედეგები. ფაზების გადაფარვის პრაქტიკა, რომელიც ჩვეულებრივ თანმიმდევრობით ხორციელდება, არის განრიგის და შესაბამისად პროექტის განხორციელებისთვის საჭირო დროის შემოკლების ტექნიკის მაგალითი, რომელიც ცნობილია სწრაფი მიყოლის (Fast Tracking) სახელწოდებით.
არ არსებობს საუკეთესო გზა იმისათვის, რომ განისაზღვროს იდეალური პროექტის ციკლი. ზოგიერთმა ორგანიზაციამ იყენებს პროექტის ციკლის სტანდარტიზებულ მოდელს, რომელიც საერთოა ყველა პროექტისათვის, სხვები აძლევენ უფლებას მენეჯმენტის განმახორციელებელ გუნდს თვითონ შეარჩიონ და აირჩიონ ამა თუ იმ პროექტისათვის საჭირო ყველაზე შესაფერი ციკლი.
ზოგადად, პროექტის ციკლი განსაზღრავს:

- რა სახის ტექნიკური სამუშაო უნდა ჩატარდეს თითოეულ ფაზაში (მაგ; რომელ ფაზაში უნდა შესრულდეს არქიტექტორის სამუშაო?)
- როდის უნდა შეჯამდეს შედეგები (deliverable) თითოეულ ფაზაში და როგორ უნდა იქნეს განხილული, შემოწმებული და დამტკიცებული თითოეული შედეგი.
- ვინ არის ჩართული თითოეულ ფაზაში (მაგ; მანქანათმშენებლობა მოითხოვს პროექტის განმახორციელებლი პირების გარკვეული სქემის მიხედვით შერჩევას).

- როგორ გაკონტროლდეს და დამტკიცდეს თითოეული ფაზა.

პროექტის ციკლის აღწერა შეიძლება იყოს ძალიან ზოგადი ან ძალიან დეტალური. დეტალური აღწერა შეიძლება მოიცავდეს ფორმებს, ცხრილებს ან კითხვარებს უკეთესი სტრუქტურირებისა და კონტროლისათვის.
ბევრი პროექტის ციკლი იზიარებს საერთო მახასიათებლებს:

- ფაზები, როგორ წესი, თანმიმდევრულია და განსაზღვრულია ტექნიკური ინფორმაციის გადაცემის რაიმე ფორმით.

ხარჯები და თანამშრომლების რაოდენობა არის პროექტის დასაწყისში ყველაზე დაბალია, პიკს აღწევს შუალედურ ფაზებში და კლებულობს როგორც კი პროექტი დასასრულს უახლოვდება.

პროექტის ციკლი მოიცავს იდენტიფიკაციის, განვითარების, განხორციელების და შეფასების ფაზებს.

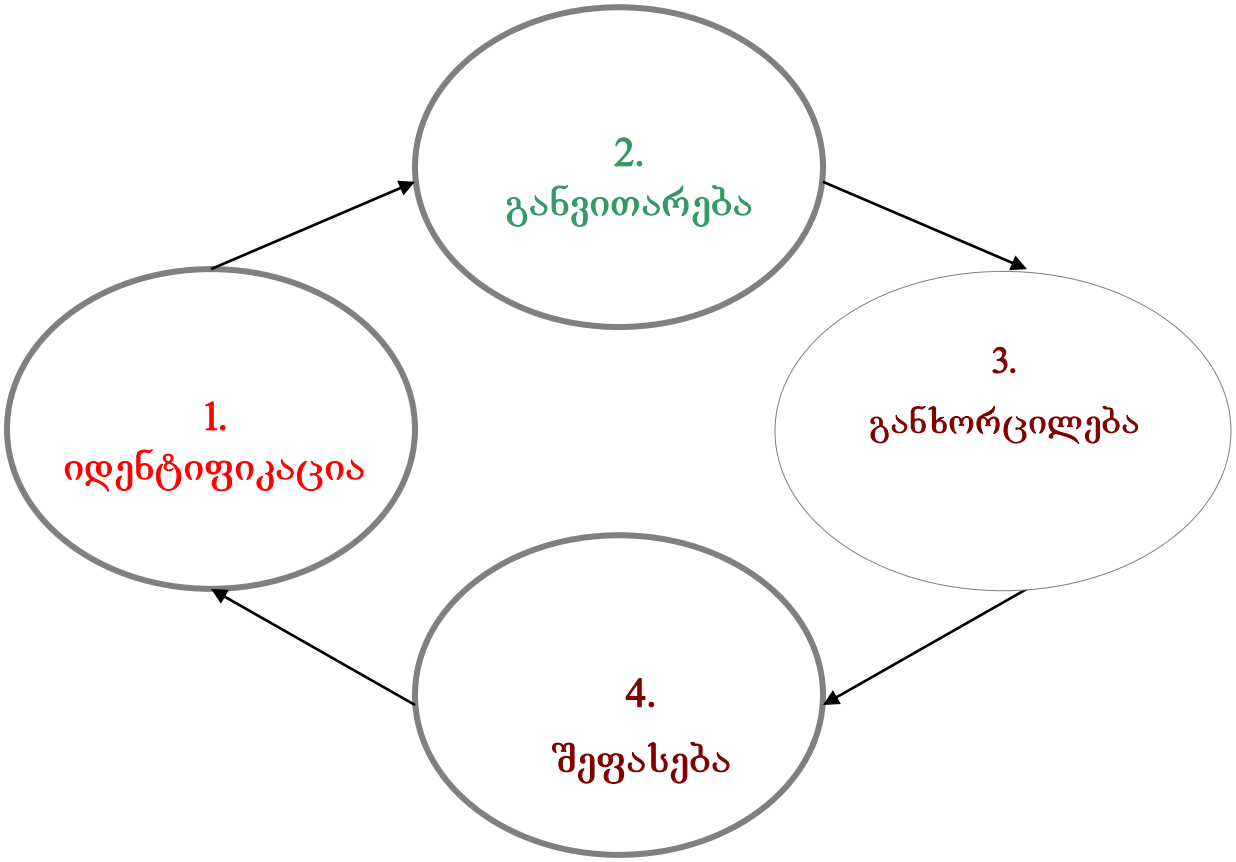

2.6 პროექტის ინიცირების განმაპირობებელი ფაქტორები

ორგანიზაციებს უჭირთ მუდმივად ცვალებად გარემოზე სწრაფად და ეფექტურად მორგება. მართვის მოძველებული სისტემების ახლით შეცვლა არ ხდება მყისიერად. ორგანიზაციების უმეტესობისთვის ცვლილებები ეს არის ნელი და მტკივნეული პროცესი. მართვის მოძველებული სისტემების ახლით სწრაფად და უმტკივნეულოდ შეცვლისა და საკუთარი მიზნების უკეთ მიღწევის მიზნით ბევრმა ორგანიზაციამ დასახა და განახორციელა შესაბამისი პროექტები.

> ტრადიციული ორგანიზაციული სტრუქტურები და მართვის სისტემები მუდმივად ცვალებადი ბიზნეს გარემოსთვის უბრალოდ არაადექვატურია რეალობის.

პროექტის მენეჯმენტის ინსტიტუტი (PMI) ასხვავებს ხუთ განსხვავებულ სტრატეგიულ გათვლას, რამაც შესაძლოა პროექტის ინიცირება გამოიწვიოს:

- ბაზრის მოთხოვნა (მაგ; ნავთობკომპანია იწყებს ახალი გამწმენდი ქარხნის აშენების პროექტს ბენზინის მუდმივი დეფიციტის საპასუხოდ);
- ორგანიზაციული მოთხოვნა (მაგ; საკუთარი შემოსავლის გაზრდის მიზნით ტრენინგ-კომპანია იწყებს ახალი ტრენინგ-კურსის შემუშავების პროექტს);
- მომხმარებლის მოთხოვნა (მაგ; ელექტრომომსახურების კომპანია იწყებს პროექტს, იმისათვის, რომ აშენდეს ქვესადგური ახალი ინდუსტრიული პარკის მომსახურებისთვის);
- ტექნოლოგიური წინსვლა (მაგ; კომპიუტერული პროგრამების მწარმოებელი ფირმა იწყებს ახალი თაობის კოპიუტერული თამაშების შექმნის პროექტს, მას შემდეგ რაც ელექტრონული კომპანიები უშვებენ ახალი თაობის სათამაშო კომპიუტერებს).
- კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნა (მაგ; საღებავების მწარმოებელი კომპანია იწყებს ტოქსიკურ მასალებთან დაკავშირებულ პროექტს).

3 პროექტის იდენტიფიკაცია

პროექტის იდენტიფიკაცია პროექტის პირველ ფაზას წარმოადგენს. ამ ფაზაში განისაზღვრება საჭიროებები, პრობლემები ან საშუალებები და დაისახება მათი გადაწყვეტის რამოდენიმე გზა.

3.1 რა არის საჭიროება?

საჭიროება არის მდგომარეობა, სპეციფიური სახის საქონელი ან მომსახურება, რომელიც მოსარგებლეთა ჯგუფის ან ჯგუფების მიერ მოთხოვნის ძირითად სახედ განიხილება.

3.1.1 რა არის საჭიროებათა შეფასება?

საჭიროებათა შეფასება არის იმ გზების სისტემატური კვლევა, თუ როგორია არსებული სიტუაცია და როგორი იყოს იგი.

3.1.2 როგორ ჩავატაროთ საჭიროებათა შეფასება?

- არსებული სიტუაცია – ეს ანალიზი უზრუნველყოფს ჩვენი მიზნების, გარემო ფაქტორების, შინაგანი და გარეგანი ზეწოლის გარკვევას.

- სასურველი ან აუცილებელი სიტუაცია – ეს განსაზღვრავს სასურველ ან საჭირო მდგომარეობებს ორგანიზაციული და პიროვნული წარმატებისთვის.

განსხვავება არსებული და სასურველი სიტუაციას შორის განსაზღვრავს ჩვენს მოთხოვნებს, მიზნებს და ამოცანებს.

საჭიროებათა შეფასებისთვის ინფორმაციის შეგროვების ყველაზე მარტივი გზა არის ინტერვიუირება, მაგრამ ინტერვიუებს აქვთ ჩარჩოები. იდეალური პროცედურა არის ინფორმაციის შეგროვება ორი ან რამოდენიმე გზის ამოყენებით.

არსებობს საჭიროებათა შეფასების რამოდენიმე ძირითადი ხერხი:

- პირდაპირი დაკვირვება
- კითხვარები
- კონსულტაციები
- შესაბამისი ლიტერატურის გაცნობა
- ინტერვიუ
- ფოკუს-ჯგუფები
- ტესტები
- ანგარიშების და სხვადასხვა ჩანაწერის შესწავლა
- მსგავსი პროექტების გაცნობა

3.2 მონაწილეთა ანალიზის მატრიცა

მონაწილეთა ფორმალური ანალიზის ჩატარების უპირატესობაა ის, რომ დაინტერესებული მხარეები განისაზღვრება პროექტის ამოცანების საბოლოოდ ჩამოყალიბებამდე. ეს ნიშნავს, რომ სხვადასხვა დაინტერებულ მხარეთა შორის ურთიერთობას ცენტრალური ადგილი უკავია პროექტში. მეტიც, ანალიზის ჩატარება სისტემატურად შესაძლებელს ხდის სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეების ჩართვას ანალიზის პროცესში.

ეს მიდგომა გვეხმარება გავიგოთ დაინტერესებულო მხარეებს რა წვლილის შეტანა შეუძლიათ პროექტში, რა პრობლემებს წააწყდებიან თუ ასე მოიქცევიან და რა ღონისძიებები უნდა გატარდეს ამ პრობლემების გადასაჭრელად.

დაინტერესებული მხარეები	**რა წვლილის შეტანა შეუძლათ?**	**პრობლემები რომლებსაც ეჯახებიან**	**საჭირო ღონისძიებები**
დაინტერესებული მხარე 1			
დაინტერესებული მხარე 2			
დაინტერესებული მხარე 3			
დაინტერესებული მხარე 4			

I სვეტი: ჩაატარეთ ბრეინსტორმინგი დაინტერებული მხარეების შესახებ

II სვეტი: დაინტერესებული მხარეების მიერ პროექტისთვის მოპოვებული რესურსები. რა წვლილის შეტანა შეუძლიათ პროექტში? (მაგ; მონაცემები ან ინფორმაცია; ადამიანური რესურსები (კადრები, ექსპერტები); ქსელი; ფინანსური რესურსები; მასალები; საშუალებები ან მოწყობილობა რომელიც პროექტში საჭირო იქნება, მანდატი; პროცედურები)

III სვეტი: პრობლემები, რომლებიც აფერხებენ პროექტის წარმატებულ დასრულებას (მაგ; დაგეგმვაში ნაკლები ჩართულობა, ფონდების ან მასალების ნაკლებობა, ინფორმაციის ან პროექტის ორიენტაციის ნაკლებობა და ა. შ.)

IV სვეტი: საჭირო ღონისძიებები

იმის მიხედვით, რაც ვიცით დაინტერესებული მხარეების შესახებ, რა ღონისძიებები უნდა გაატარონ პროექტის განმახორციელებელმა პირებმა.

ეუთოს მაგალითი

დაინტერესებული მხარე	**მახასიათებლები**	**ინტერესები**	**რა სახის დახმარება შეუძლიათ**	**სანაცვლოდ რისი გაღება გახდება საჭირო**	**საჭირო ღონისძიებები**
დაინტერესებული მხარე 1					
დაინტერესებული მხარე 2					
დაინტერესებული მხარე 3					
დაინტერესებული მხარე 4					

3.3 ინტერვიუ

ინტერვიუსთვის მზადება

- აირჩიეთ მყუდრო გარემო. თავი აარიდეთ მყვირალა ფერებს და ხმაურს, დარწმუნდით, რომ ის, ვისაც უტარებენ ინტერვიუს კომფორტულად გრძნობს თავს (ეს შეგიძლიათ პირდაპირ კითხოთ) და ა.შ. ხშირად რესპონდენტს ინტერვიუს ჩატარება საკუთარ სახლში ან სამსახურში ურჩევნია.
- ახსენით ინტერვიუს მიზანი
- შეეხეთ კონფიდენციალობის ნორმებს. აღნიშნეთ კონფიდენციალურობის ნებისმიერი ტერმინი
- ახსენით ინტერვიუს ფორმატი. ახსენით ინტერვიუს ტიპი და ხასიათი რომელსაც ატარებთ
- აღნიშნეთ საშუალოდ რამდენ ხანს გაგრძელდება ინტერვიუ
- განმარტეთ, როგორ შეიძლება მომავალში თქვენთან დაკავშირება
- მიეცით საშუალება დაგისვან შეკითხვები მანამ, სანამ ინტერვიუს დაიწყებთ
- ნუ დაეყრდნობით მეხსიერებას მათი პასუხების გასახსენებლად. ითხოვეთ ინტერვიუს ჩაწერის ნება ან მოიყვანეთ ვინმე, ვინც გააკეთებს ჩანაწერებს.

არსებობს კითხვების სამი ძირითადი ტიპი, რომელიც ინტერვიუს სხვადასხვა ნაწილზეა მორგებული: ღია, დახურული და ჰიპოთეტური.

3.3.1 როდის დავსვათ ღია ტიპის კითხვები

ინტერვიუს დაწყების წინ ურთიერთგაგების ატმოსფეროს შექმნის მიზნით უკეთესია ღია ტიპის კითხვების დასმა. მსგავსი ტიპის კითხვები აძლევს საშუალებას რესპონდენტს თქვას რაც უნდა და აქედან გამომდინარე გამოხატავს საკუთარ შეხედულებებს და მისდომებს.

3.3.2 როდის დავსვათ დახურული ტიპის კითხვები

როდესაც საჭიროა რესპოდენტის პასუხები შემოფარგლულ იქნას ერთ კითხვაზე უნდა დაისვას დახურული ტიპის კითხვები. “ფიქრობთ, რომ უნივერსიტეტის ყველა სტუდენტმა უნდა იცოდეს კომპიუტერთან მუშაობა?” ეს არის დახურული კითხვის მაგალითი, რომელიც

მოითხოვს “დიახ”, “არა”, “არ ვიცი” ან “შეიძლება”, “დიახ, ამ პირობების გათვალისწინებით” და ა.შ. ტიპის პასუხებს. სასურველია, ინტერვიუს დროის კითხვების რაოდენობა შემოფარგლული იყოს, რადგან ადამიანებს არ უყვართ ბევრი კითხვის დასმა.

3.3.3 როდის დავსვათ ჰიპოთეტური კითხვები

ინტერვიუს დაწყებამდე შესაძლოა საჭირო გახდეს რამოდენიმე ჰიპოთეტური კითხვის დასმა. მაგ; თუ თქვენ აფასებთ სტუდენტების მიერ ტესტის დროს გადაწერის შემთხვევებს, კითხვა შეიძლება დაისვას ასე: “თუ თქვენ იქნებოდით დარწმუნებული, რომ არ გამოგიჭერენ და საბოლოო გამოცდაზე აუცილებლად მაღალი ქულის მიღება გესაჭიროებათ, გადაიწერდით “შპარგალკიდან”?

3.4 ინტერვიუს კითხვების შემუშავების სტრატეგიები

ქვემოთ მოცემულია სტრატეგიები ინტერვიუსთვის საჭირო კითხვების შესამუშავებლად:

- დახურული კითხვები: რა სახის სპეციფიური ინფორმაცია გჭირდებათ თქვენ?
- ღია კითხვები: რა ფილოსოფიური საკითხები უდევს თქვენს კვლევას საფუძვლად? რა ორი ან სამი ძირითადი კითხვა გინდათ დაუსვათ რესპონდენტს რომ გაიხსნას იგი და შედგეს ნამდვილი კომუნიკაცია?
- ჰიპოთეტური კითხვები: როგორი სიტუაციები უნდა მოიფიქროთ, რომ განსაზღვროთ რესპოდენტის გრძნობები და პასუხები სხვადასხვა შემთხვევაში?

3.5 შეხვედრები, შეხვედრების განრიგი

ვინც არ უნდა აწყობდეს და უძღვებოდეს შეხვედრას, აუცილებელია იცოდეს რის გაკეთებას ისახავს მიზნად. იმის მიზეზი, რის გამოც შეხვედრის მონაწილე ადამიანების 90%-ისთვის ეს შეხვედრები მოსაწყენია, არის ის, რომ შეხვედრის მიზნები მის სტრუქტურასა და ხანგრძლივობასთან კონფლიქტში მოდის. არსებობს შეხვედრი სამი განსხვავებული ტიპი, რომელთაგანაც თითოეული შესაბამისი პრობლემის დარეგულირებისთვის საუკეთესოა.

- **მაღალ-ინტერაქტიული დისკუსია**

შეხვედრაში მონაწილეობს პროექტის/ორგანიზაციის ყველა თანამშრომელი. ფოკუსი მიმართულია სპეციფიური საკითხების გადაჭრისკენ ალტერნატიული იდეების ძიების გზით. მონაწილეთა რაოდენობა: 2-8 (მცირე). მაგალითები: დისკუსია დიზაინის შესახებ, ბრეინსტორმინგი, კრიზისის მენეჯმენტი, და ა.შ.

- **ანგარიშის წარდგენის ან საშუალოდ ინტერატიული დისკუსია**

ერთი ადამიანი საუბრობს რაიმე საკითხზე და საჭიროა სხვებმა გაიაზრონ ეს საკითხი. შეხვედრის მიზანია ხარისხიანი და გამოსადეგი უკუკავშირის (Feedback) მიღება ან ცოდნის გაზიარება. რამდენიმე ადამიანმა შეიძლება ცვალოს როლები თუ ვინ დასვამს კითხვებს და ვინ უპასუხებს. მონაწილეთა რაოდენობა: 5-15 (საშუალო-დიდი). მაგალითები: საგანგებო განხილვა, მენეჯმენტის განხილვა და მცირე პრეზენტაციები.

- **სტატუსის ან პროექტის განხილვა**

შეხვედრის მიზანია გუნდის მუშაობის ან პროექტის სტატუსის შეჯამება. შეხვედრა საშუალებას აძლევს მენეჯერს პროექტის მიმდინარეობის პროცესში შეტანილ იქნას

ცვლილებები და გაიცეს ახალი დირექტივები მენეჯმენტის მთელი ჯგუფისთვის ერთდროულად. მონაწილეთა რაოდენობა: 10-100 (საშუალო-დიდი). მაგალითები: სტატუსის, პროექტის, ან დიდი პრეზენტაციის განხილვა.

შეხვდერები კარგად მიდის თუ მას ვინმე უძღვება. შეხვედრა უნდა დაიწყოს ადამიანების გაცნობით, მონაწილეთათვის შეხვედრის გეგმის განმარტებით და დისკუსიით.

შეხვედრის კარგი გეგმის მახასიათებლები:

- მიზეზი, რამაც გამოიწვია შეხვედრის გამართვის საჭიროება
- მიზნები
- მიზნების მიღწევის გზები
- ვინ ისაუბრებს?
- დრო (რიცხვი, საათი)
- ადგილი
- სხვა საკითხები (რეგისტრაცის პროცედურები, სამოსის კოდი და ა.შ.)

3.6 მეორეხარისხოვანი ინფრომაციის მოპოვება

მეორეხარისხოვანი მონაცემები (ან ინფორმაცია) არის ინფორმაცია, რომელიც მოპოვებულია ხალხის ან სააგენტოების მიერ სხვა პროექტისთვის. ასეთი ინფორმაცია შეიძლება შეგროვებულ იქნეს მკვლევარის მიერ თვითონ ორგანიზაციის შიგნით (შიდა წყარო) ან ორგანიზაციის გარეთ (გარე წყარო). პირველადი ინფორმაცია არის ის რაც ჩვენი საკუთარი მცდელობებით ან პირველწყაროდან არის მოპოვებული. ჩვეულებრივ, მეორეხარისხოვან ინფორმაციას იყენებენ, იმისთვის, რომ ჰქონდეთ წარმოდგენა ზოგად ტენდენციენზე და კონკურენტებზე, მაშინ როცა პირველადი კვლევა გამოიყენება უფრო სპეციფიური მოთხოვნების აღმოსაჩენად, ან კონკურენტების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად.

მეორეხარისხოვანი ინფორმაციის მოპოვების მიზეზები:

- მას შეუძლია პრობლემის გადაჭრა
- თუ მეორეხარისხოვანი ინფორმაცია შეიცავს ადექვატურ მონაცემებს, მაშინ პირველადი მონაცემების შეგროვება აღარ არის საჭირო.
- მას შეუძლია შეამციროს ხარჯები

მეორადი წყაროების ფართო ძიება შესაძლებელია დროის და ხარჯების დაზოგვით, მაშინ როცა პირველადი ინფორმაციის მოპოვებას ბევრად მეტი დრო და ფული სჭირდება. ადვილად ხელმისაწვდომი და სწრაფი ინტერნეტი კომპანიებს უფრო ეფექტურს ხდის, რადგან:

- ხდება პირველადი კვლევის განმეორების თავიდან აცილება
- ხდება პირველადი კვლევისთვის საჭირო ხარჯების დაზოგვა.

მაშინაც კი, როდესაც მეორეხარისხოვანი ინფორმაცია არ არის ადექვატური პრობლემის გადაჭრისთვის, მას აქვს შემდეგი დამატებითი გამოყენება:

- პრობლემის განსაზღვრა და მისი გადაწყვეტისთვის ჰიპოტეზის ფორმულირება
- მეორეხარისხოვანი ინფორმაციის მოპოვება და ანალიზი ყოველთვის უკეთ წარმოაჩენს პრობლემას და მის კონტექსტს და ხშირად ისეთ გადაწყვეტას გვთავაზობს, რომელიც ადრე არ ყოფილა გააზრებული. ასე, რომ მეორეხარისხოვანი ინფორმაცია წარმოადგენს მნიშვნელოვან წყაროს კვლევაში.
- პირველადი მონაცემების შეგროვების დაგეგმვა

- იმ მეთოდების და ხერხების ანალიზი, რომელიც მსგავს სფეროში ჩატარებულა სხვა მკვლევარების მიერ დაგეხმარებათ ახალი კვლევის დაგეგმვაში. მეორეხარისხოვანი ინფორმაცია ასევე ღირებულია იმისთვის, რომ ადრეული კველებთან მიმართებაში კლასიფიკაციები დადგინდეს და უკეთ გაანალიზდეს ტენდენციები.
- პოპულაციის განსაზღვრა და შერჩევის აღება

ადრეული ინფორმაცია და შერჩევები შეიზლება გამოგვადგეს ახლანდელი პირველადი ინფორმაციის მოპოვების კლასიფიკაციისთვის.

როგორც წესი, არც ერთი პროექტი არ ხორციელდება მეორეხარსიხოვანი ინფორმაციის წყაროების ძიების გარეშე. ეს ძიება პროებლემის ძიების დროს ხორციელდება და ახალი პირველადი წყაროებიდან ინფორმაციის მოძიებამდე. არსებობს ამის რამდენიმე მიზეზი.

3.6.1 მეორეხარისხოვანი ინფორმაციის ტიპები

მეორეხარისხოვანი ინფორმაცია ერთიანდება ორ კატეგორიაში. განმასხვავებელ მახასიათებელს წარმოადგენს ის, თუ სად მოიპოვე ინფორმაცია, ორგანიზაციის/ კომპანიის შიგნით (შიდა) თუ მის გარეთ (გარე).

მეორეხარისხოვანი ინფორმაციის გარე წყაროებია:

- მთავრობა (ეროვნული, ფედერალური, სახელმწიფო და ადგილობრივი)
- სავაჭრო ასოცოაციები და პრესა
- პრესა და პროფესიული ჟურნალები
- უმაღლესი სასწავლებლები
- კომერციული ფირმები

4. პროექტის ხედვა

ერთ-ერთი სირთულე მმართველი გუნდისთვის არის თანამშრომელთა დიდი ხნის განმავლობაში ერთი და იმავე მიზნებზე კონცენტრირება-ფოკუსირება. ყველა ლიდერს ეშინია, რომ ადრე თუ გვიან მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები დავიწყებული იქნება. შესაძლებლელია, რომ თვითონ მენეჯერს დაავიწყდეს ის მიმართულება, საითაც უნდა განვითარდეს პროექტი. ასე რომ, მენეჯმენტის სირთულე არა მარტო პროექტის განვითარებისთვის სწორი მიმართულების არჩევა, არამედ მიმართულების ბოლომდე შენარჩუნებაც არის.
სწორედ ეს მიზეზები განაპირობებენ პროექტის ხედვის მნიშვნელობას.
ტერმინი „პროექტის ხედვა“ გვიჩვენებს პროექტის მენეჯერის წინასწარ იდეებსა და მოსაზრებებს იმის შესახებ, თუ რა პრობლემის გადაჭრას ან მდგომარეობის შეცვლას შეიძლება ისახავდეს პროექტი მიზნად.
პრეოქტის ხედვა არის საფუძველი, რომელზე დაყრდნობითაც წყდება პროექტის განვითარების და განხორციელების დაწყების საკითხი. პროექტის ხედვის ფორმულირების პროცესში განისაზღვრება რამდენიმე საფეხური:

- ცვლილებების საჭიროების იდენტიფიცირება
- გუნდის საკვანძო წევრებთან შეხვედრა
- იმის განსაზღვრა, თუ რას შეცვლის პროექტი მოვლენების იდეალურად განვითარების შემთხვევაში
- საერთო ხედვის ჩამოყალიბება

- პროექტის შესრულებადი ხედვის ფორმულირება

იდეალური პროექტის ხედვა მოიცავს შემდეგ პუნქტებს:

- პროექტის მიზანი – მიუთითებს იმ კონკრეტულ ამოცანებზე, რომლის მიღწევასაც ისახავს პროექტი მიზნად
- კავშირი ორგანიზაციის ზოგად მიზნებთან – პროექტი უნდა ჯდებოდეს იმ ზოგად პრიორიტეტებში, რაც განმახორციელებელ ორგანიზაციას გააჩნია
- პროექტის შედეგები – აღწერს იმ შედეგებს, რასაც მოიტანს პროექტი
- ბარიერები – ნებისმიერი სავარაუდო ბარიერი, რასაც შეიძლება შეხვდეს პროექტი მიმდინარეობისას
- მოსაზრებები და ვარაუდები – გარე ფაქტორები, რომლებმაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს პროექტზე და რომელზეც არ არსებობს პირდაპირი ზემოქმედების მექანიზმები

4.1 პრობლემის ანალიზი და პრობლემის ხე

პრობლემის ანალიზი ფოკუსირებულია პრობლემების გამომწვევი ფაქტორების ზუსტ იდენტიფიკაციაზე. პროექტის მიზნები დამოკიდებული იქნება იმ პრობლემებზე, რამლებმაც გამოიწვიეს პროექტის ინიცირების აუცილებლობა. ასე, რომ ჩვენ უნდა არსებობდეს ზუსტი წარმოდგენა ამ ფაქტორების და მათი ურთიერთკავშირის შესახებ. კონკრეტული პრობლემების იდენტიფიკაციას და მათ დაჯგუფებას თემატური ან სხვა ტიპის კავშირის შესაბამისად პრობლემების ხის აგების პროცესი ეწოდება.

4.2 მრავალმხრივი მიდგომის პრინციპი

- გვაქვს პრობლემის გადაწყვეტის გზა
- ხელახლა ვუღრმავდებით პრობლემას
- ვადგენთ გამომწვევ მიზეზებს
- განვსაზღვრავთ პრობლემის გადაწყვეტის ალტერატიულ გზებს
- ვაკეთებთ დასაბუთებულ/ინფორმირებულ არჩევანს (Informed choise).

პრობლემა არის უმწეო მდგომარეობის ან უარყოფითი სიტუაციის აღწერა.

პრობლემის ხის განვითარებაში ხუთი ძირითადი საფეხური განისაზღვრება:

1. შეფასების პროცესში მიღებული უკუკავშირი განიხილება როგორც საწყისი წერტილი. პროექტის გუნდთან ერთად ტარდება ბრეინსტორმინგი პრობლემების გამოსავლენად. ხდება პრობლემების მოკლე და ზუსტი ფორმით დაფიქსირება.
2. ხდება პრობლემების ნეგატიური ფორმით პერეფრაზირება და სტიკერზე დაფიქსირება. სტიკერები ჯგუფდება ფლიპჩარტის ქაღალდზე ან დაფაზე.
3. პრობლემების დაჯგუფების პროცესში პროექტის მთლიანი ჯგუფი მონაწილეობს. პრობლემების დაჯგუფება ხდება შინაარსობრივი და გეოგრაფიული სიახლოვის ფაქქტორების გათვალისწინებით. საჭიროების შემთხვევაში შესაძლოა უკვე დაჯგუფებული პრობლემების გადაჯგუფება.
4. პრობლემები დაჯგუფება ხდება ისე, რომ გამოხატული იყოს გზა, რომლითაც ისინი ერთანეთთან არიან დაკავშირებული: არის თუ არა თითოეული მათგანი მიზეზი ან შედეგი მეორის? შეაქვს თუ არ მას წვლილი სხვა პრობლემის წარმოქმნაში? მიზეზი და შედეგი წარმოდგენილი უნდა იყოს ლოგიკური თანმიმდევრობით. პრობლემების თითოეული ჯგუფი გახდება განშტოება და პრობლემების ხე დაიწყებს კენწეროსკენ წასვლას.

5. ხის წვერი შეადგენს მთავარი პრობლემის ცენტრალურ საკითხს. მთავარი პრობლემა თავის თავში მოიაზრებს და აჯამებს განშტოებების პრობლემებსაც.

მაგალითი:

1-2 საფეხური – ტარდება ბრეინსტორმინგი პრობლემების შესახებ; ხდება გამოვლენილი პრობლემების ნეგატიური ფორმით პერეფრაზირება.

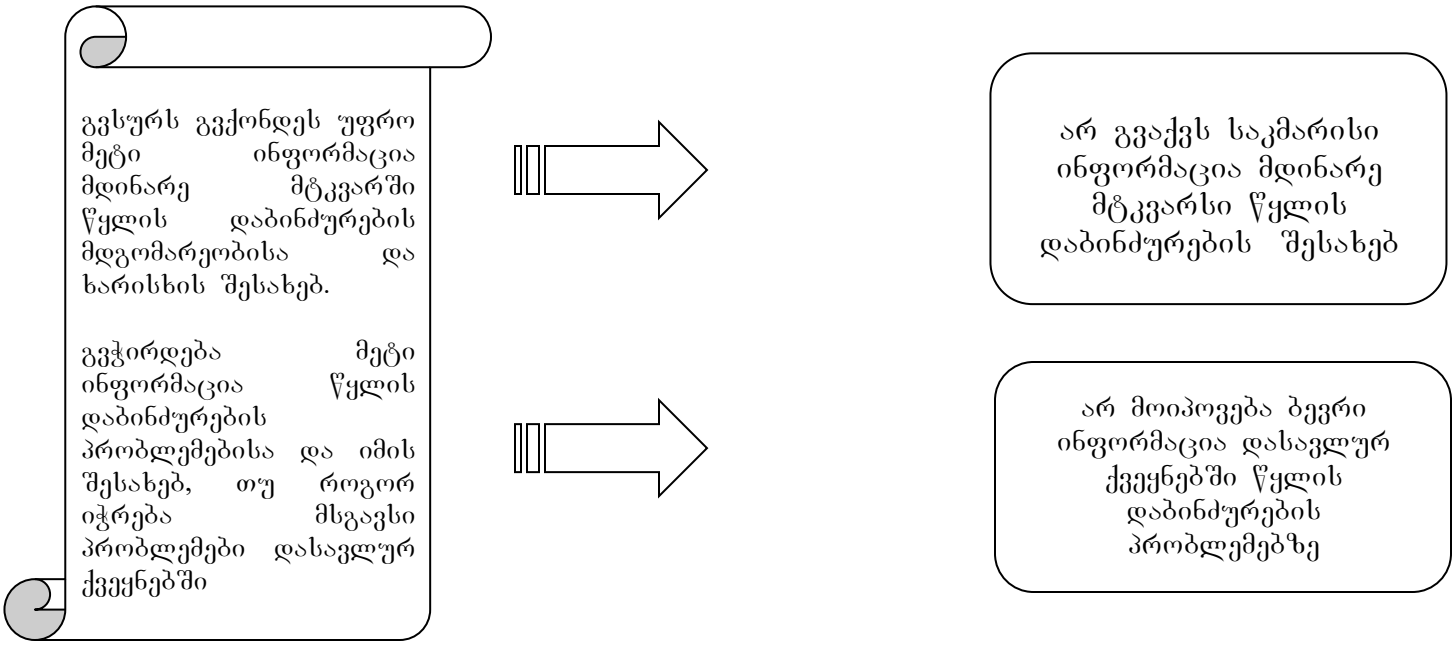

<u>ბრეინსტორმინგი</u>

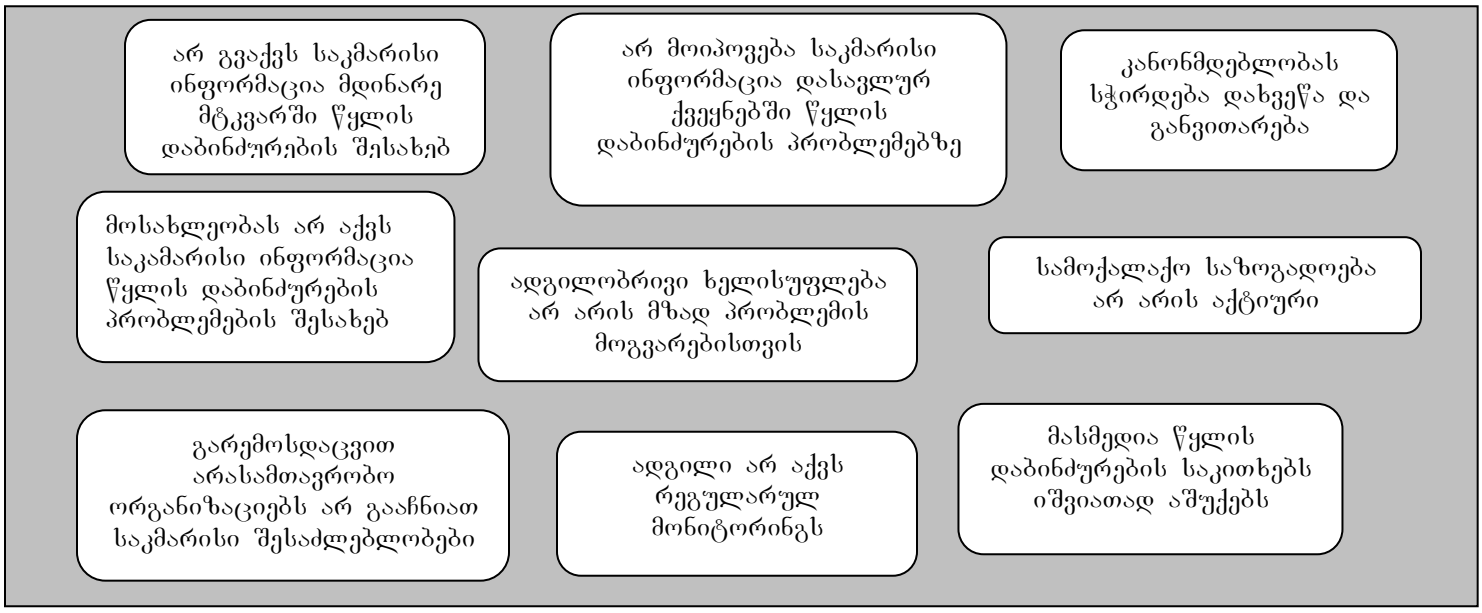

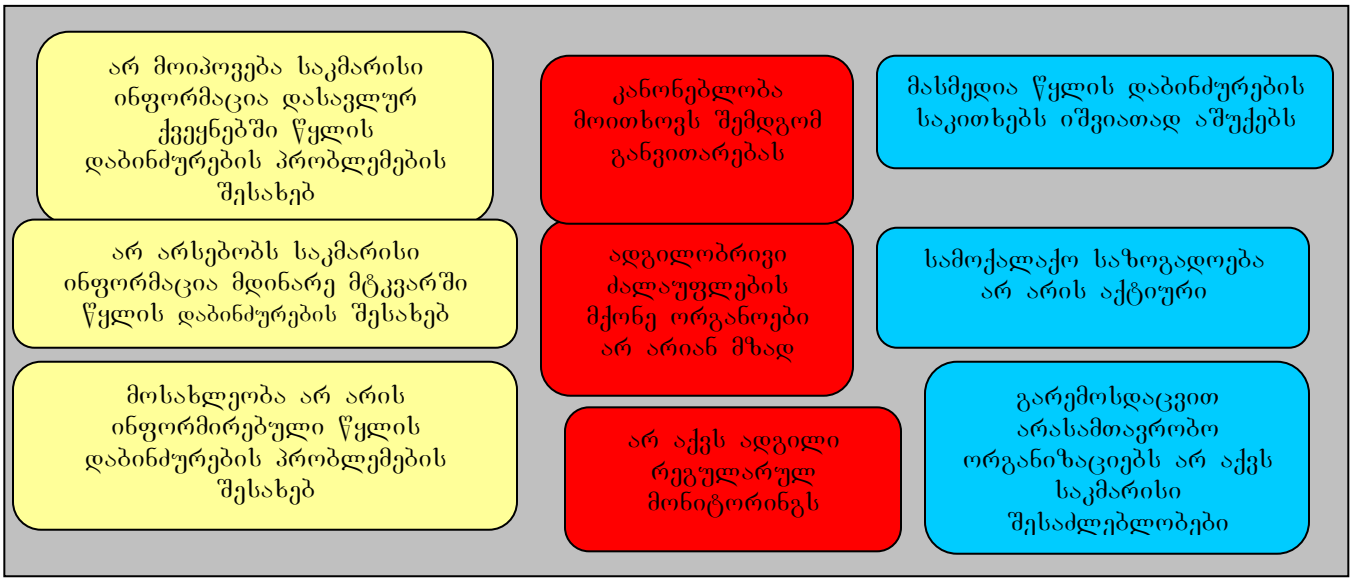
არ მოიპოვება საკმარისი ინფორმაცია დასავლურ ქვეყნებში წყლის დაბინძურების პრობლემების შესახებ
არ არსებობს საკმარისი ინფორმაცია მდინარე მტკვარში წყლის დაბინძურების შესახებ
მოსახლეობა არ არის ინფორმირებული წყლის დაბინძურების პრობლემების შესახებ
კანონებლობა მოითხოვს შემდგომ განვითარებას
ადგილობრივი ძალაუფლების მქონე ორგანოები არ არიან მზად
არ აქვს ადგილი რეგულარულ მონიტორინგს
მასმედია წყლის დაბინძურების საკითხებს იშვიათად აშუქებს
სამოქალაქო საზოგადოება არ არის აქტიური
გარემოსდაცვით არასამთავრობო ორგანიზაციებს არ აქვს საკმარისი შესაძლებლობები

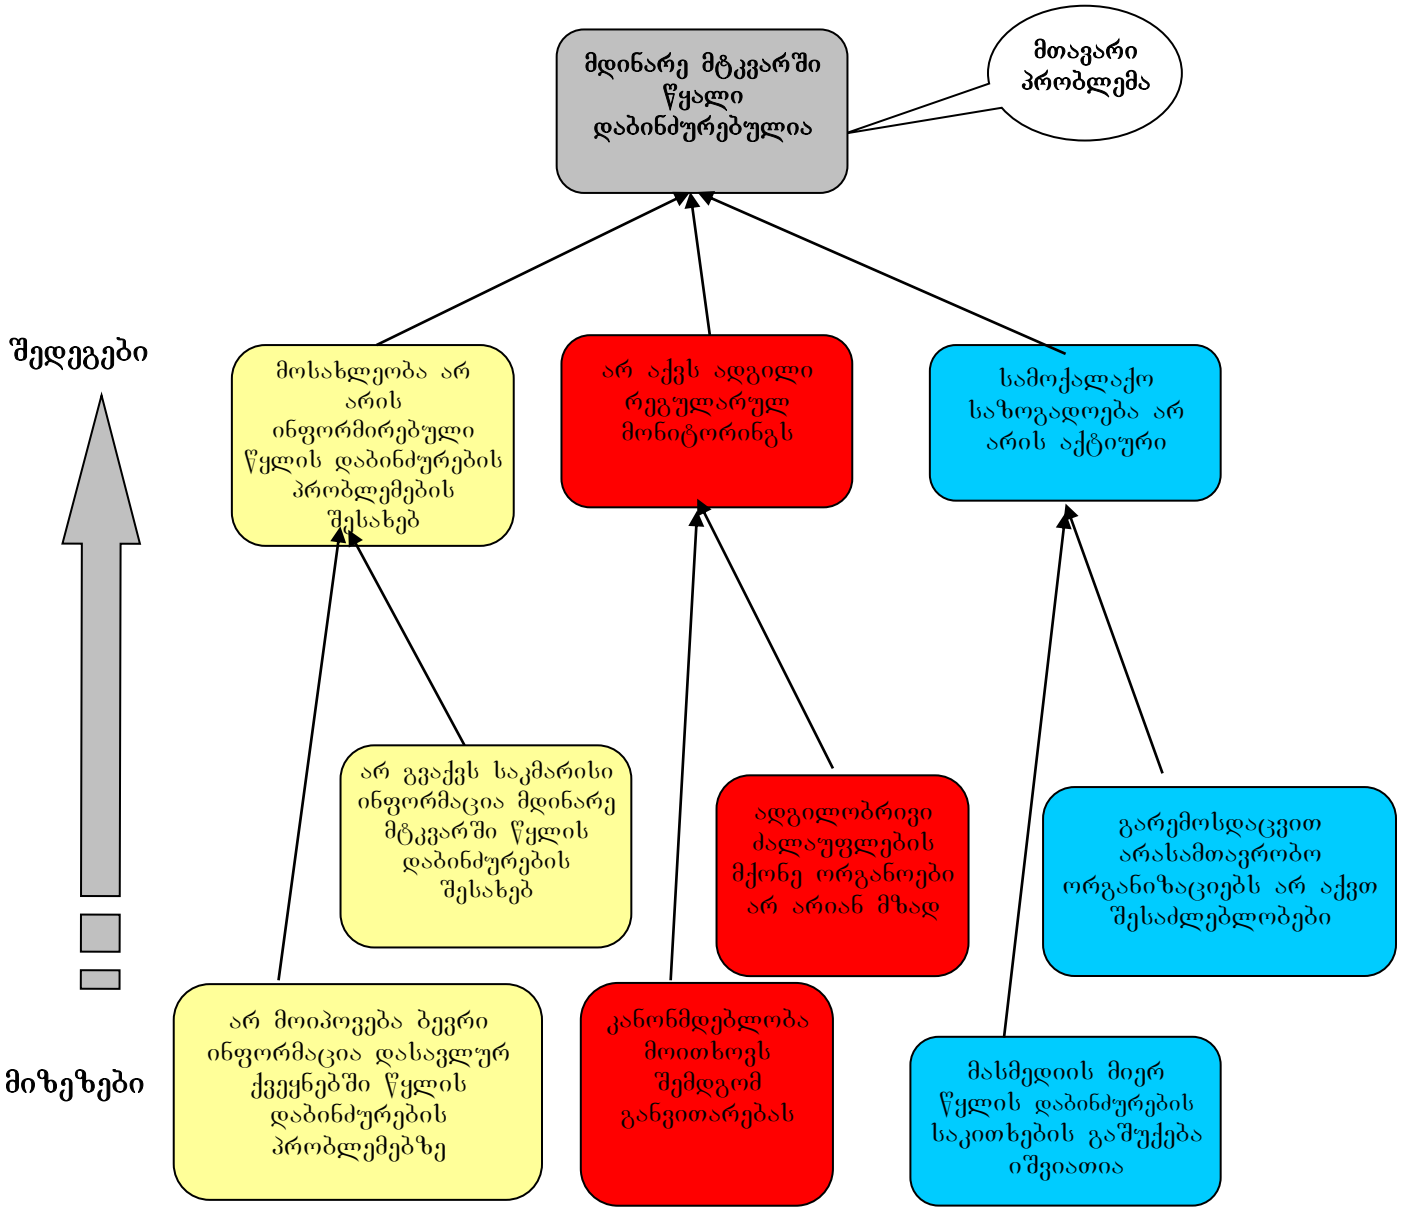
მდინარე მტკვარში წყალი დაბინძურებულია
მთავარი პრობლემა
შედეგები
მოსახლეობა არ არის ინფორმირებული წყლის დაბინძურების პრობლემების შესახებ
არ აქვს ადგილი რეგულარულ მონიტორინგს
სამოქალაქო საზოგადოება არ არის აქტიური
არ გვაქვს საკმარისი ინფორმაცია მდინარე მტკვარში წყლის დაბინძურების შესახებ
ადგილობრივი ძალაუფლების მქონე ორგანოები არ არიან მზად
გარემოსდაცვით არასამთავრობო ორგანიზაციებს არ აქვთ შესაძლებლობები
მიზეზები
არ მოიპოვება ბევრი ინფორმაცია დასავლურ ქვეყნებში წყლის დაბინძურების პრობლემებზე
კანონმდებლობა მოითხოვს შემდგომ განვითარებას
მასმედიის მიერ წყლის დაბინძურების საკითხების გაშუქება იშვიათია

4.3 ბრეინსტორმინგის ტექნიკა

ბრეინსტრომინგი არის ჯგუფთან მუშაობისას იდეების შემუშავების ერთ-ერთი გზა

ბრეინსტორმინგის ეტაპები

- გქონდეთ ერთმნიშვნელოვანი და ნათლად ჩამოყალიბებული პრობლემა
- წინასწარ შეარჩიეთ ერთი ადამიანი, რომელიც დაგეხმარებათ ყველა იდეის ჩაწერაში
- იმუშავეთ ხუთიდან ათ ადამიანიამდე შემადგენლობის მქონე ჯგუფებთან
- დაიხმარეთ ვინმე, ვინც წაახალისებს:
- თავისუფალ აზროვნებას
- ნებისმიერი იდეის მიღებას და ჩაწერას
- უცნაურ იდეებს

გამოყენება:

- სპეციფიური პრობლემის გადასაწყვეტად
- მივცეთ ჯგუფის ყველა წევრს შესაძლებლობა გამოთქვან ნებისმიერი აზრი, რაც კი თავში მოუვათ
- გვინდა უზრუნველვყოთ იდეების დიდი რაოდენობა
- გავამხნევოთ ჯგუფის წევრები იდეების დაჯგუფებასა და გამოყენებაში
- გვინდა მივიღოთ ყველა იდეა

4.4 მაინდ მეფინგი (Mind Mapping)

მაინდ მეფინგი არის ერთი-ერთი ყველაზე მარტივი და ყველაზე ძლიერი იარაღთაგანი რაც ადამიანს შეუძლია ჰქონდეს მის შემოქმედებით "იარაღების ყუთში". ის არის არასწორხაზოვანი გზა ინფორმაციის ოგანიზებისა და ტექნიკა, რომელიც საშუალებას გვაძლევს დავიჭიროთ ჩვენი იდეების ბუნებრივი მიმდინარეობა. მაინდ მეფინგი რვა საფეხურს მოიცავს:

ნაბიჯი 1: დაიწყეთ ფურცლის შუაგულიდან

ჩვენი გონება ფოკუსირებულია ფურცლის შუაგულში. სწორედ ამიტომ მაინდ მეფინგი იწყება იმ სიტყვით ან გამოსახულებით, რომელიც წარმოადგენს იმის სიმბოლოს რომელიც ფურცლის შუაგულში მოთავსებული და რაზეც გსურთ რომ იფიქროთ

ნაბიჯი 2: დაივიწყეთ სერიოზულობა!

დაწერეთ ან დახატეთ რაც პირველი მოგივათ თავში, როდესაც დაიწყებთ ფიქრს ურთიერთდაკავშირებულ საკითხებზე, ადამიანებზე, საგნებზე, მიზნებზე და ა.შ. დაალაგეთ თქვენი აზრები მთავარი აზრის გარშემო. ეს შეიძლება იყოს ნებისმიერი რამ, თუნდაც უცნაურად ან უმნიშვნელოდ მოგეჩვენოთ იგი.

ნაბიჯი 3: თავისუფალი აზროვნება

როგორც კი გაჩნდება იდეა, ჩაინიშნეთ იგი ცენტრალური საკითხის განშტოებების ხაზებზე. მიეცით საშუალება იდეებს წარმოქმნან განშტოებები და ქვეგანშტოებები. დაწერეთ ნებისმიერი იდეა განსჯის და შეფასების გარეშე.

ნაბიჯი 4: იაზროვნეთ მაქსიმალურად სწრაფად

მიყევით იდეების სწრაფ დინებას. მოინიშნეთ ისინი სიტყვების, სურათების, კოდების ან სიმბოლოების სახით.

ნაბიჯი 5: წარმოიდგინეთ, რომ არანაირი შეზღუდვა არ არსებობს

ნუ მოექცევით "ჩარჩოებში". ყველაფერი შესაძლებელია. გამოიყენეთ სქელი მარკერები, ფლომასტერები.

მაინდ მეფინგის ტექნიკა (გაგრძელება)

ნაბიჯი 6: შეფასებისას ნუ იჩქარებთ

ისევ და ისევ, ყველაფერი შესაძლებელია. დაუკავშირებელი საკითხებიც კი შეიძლება აღმოჩნდეს რელევანტური მოგვიანებით. იფიქრეთ ისე, თითქოს ახდენთ ბრეინსტორმინგს. სხვა შემთხვევაში თქვენი გონება გაიყინება იმ "დაუკავშირებელ სიტყვაზე" და კარგი იდეების გენერირებას ვეღარ მოახდენთ.

ნაბიჯი 7: მიდი, მიდი, მიდი

აუცილებლად ამოძრავე ხელები. თუ იდეების წარმოქმნა შენელდა ცარიელი ხაზები გაავლეთ და დააკვირდით თქვენს გონებას ხომ არ წააწყდით უეცრად რაიმე იდეას. შეგიძლიათ შეცვალოთ ფერები და ხელახლა "დატენოთ" გონება. ადექით და დაკიდეთ მაინდ მეფი დაფაზე ან მოლბერტზე და და უფრო მეტი ენერგია გექნებათ.

ნაბიჯი 8: დაამატეთ კავშირები

თუ ხედავთ კავშირებს ძირითად აზრთან და შეგიძლიათ დაამატოთ ქვეგანშტოებები. იმ შემთხვევაში, თუ ვერ ხედავთ კავშირებს, მაინც ეცადეთ მიუერთოთ თქვენი იდეები მთავარ საკითხს, ორგანიზება მოგვიანებითაც შეიძლება. მთავარია მოახდინოთ იდეების გენერირება და გადმოიტანოთ ისინი ფურცელზე.

5 პრიორიტეტების დასახვა

პრობლემების ხის დასრულების საფეხურის შემდეგ საჭიროა პრიორიტეტების დასახვა. არცერთ ორგანიზაციას არ გააჩნია ყველა პრობლემის მოგვარების რესურსი, ამიტომ პრიორიტეტიზაცია აუცილებელია.

- პრიორიტეტიზაცია შეიძლება მოხდეს:
- პრობლემის მნიშვნელობის მიხედვით (არის თუ არა პრობლემა იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ მოხდეს პროექტის ინიცირება ?)
- ორგანიზაციის მიზნების მიხედვით (იქნება თუ არა ეს პრობლემები ორგანიზაციის მიზნებთან დაკავშირებული?)
- რესურსებზე ხელმისაწვდომობის მიხედვით (არის თუ არა საკმარისი რესურსები პროექტის განვითარებისთვის და განხორციელებისთვის?)
- სამუშაოსთვის განკუთვნილი დროის მიხედვით (არის თუ არა საკმარისი დრო იმისთვის, რომ ეფექტურად გადაიჭრას პრობლემა პროექტის განხორციელებით)
- შედეგების მდგრადობის მიხედვით (იქნება თუ არა პროექტის შედეგები მდგრადი?)

5.1 გეგმის დასახვა/მიზნების დასახვა

> დაგეგმვის მიზანია პროექტის მენეჯმენტის შემდგომი ფასილიტაცია

პროექტის დაგეგმვის/განვითარების პირველადი მიზანი არის მიმართულებების დეტალურად ჩამოყალიბება და პროექტის გუნდისთვის იმის განმარტება, თუ რა უნდა გაკეთდეს, როდის უნდა გაკეთდეს და რა რესურსები უნდა იქნა გამოყენებული იმისათვის, რომ პროექტი წარმატებით განხორციელდეს.

- პროექტის გეგმის შემუშავების პროცესი განსხვავდება სხვადასხვა ორგანიზაციისთვის, მაგრამ ნებისმიერი გეგმა უნდა მოიცავდეს შემდეგ ელემენტებს:
- მიზნები – მოიცავს ზოგადი მიზნების დეტალურ განმარტებებს
- დროის განრიგი – მნიშვნელოვანი მოვლენების ჩამონათვალს და სხვადასხვა განრიგს
- რესურსები – ადამიანური, ფინანსური და მატერიალური
- რისკის მენეჯმენტის გეგმა – მოიცავს შესაძლო პრობლემებს, ისევე როგორც შესაძლო წარმატებებს, რომლებიც გავლენას მოახდენენ პროექტზე.

- პროექტის გეგმის შემუშავებიათვის განმეორებული უნდა იქნას პრობლემების ხის შემადგენელი პუნქტები, რათა გამახვილდებს ყურადღება იმ პირობებზე ან მდგომარეობაზე, რომლის მიღწევას ან გაუმჯობესებასაც ეცდება პროექტი. შედეგად, მიზნები და საშუალებები ამ მიზნების მისაღწევად, ჩაანაცვლებს პრობლემის ხეში არსებულ მიზეზებს და შედეგებს.

<u>**მაგალითი:**</u>
პრობლემების ხე

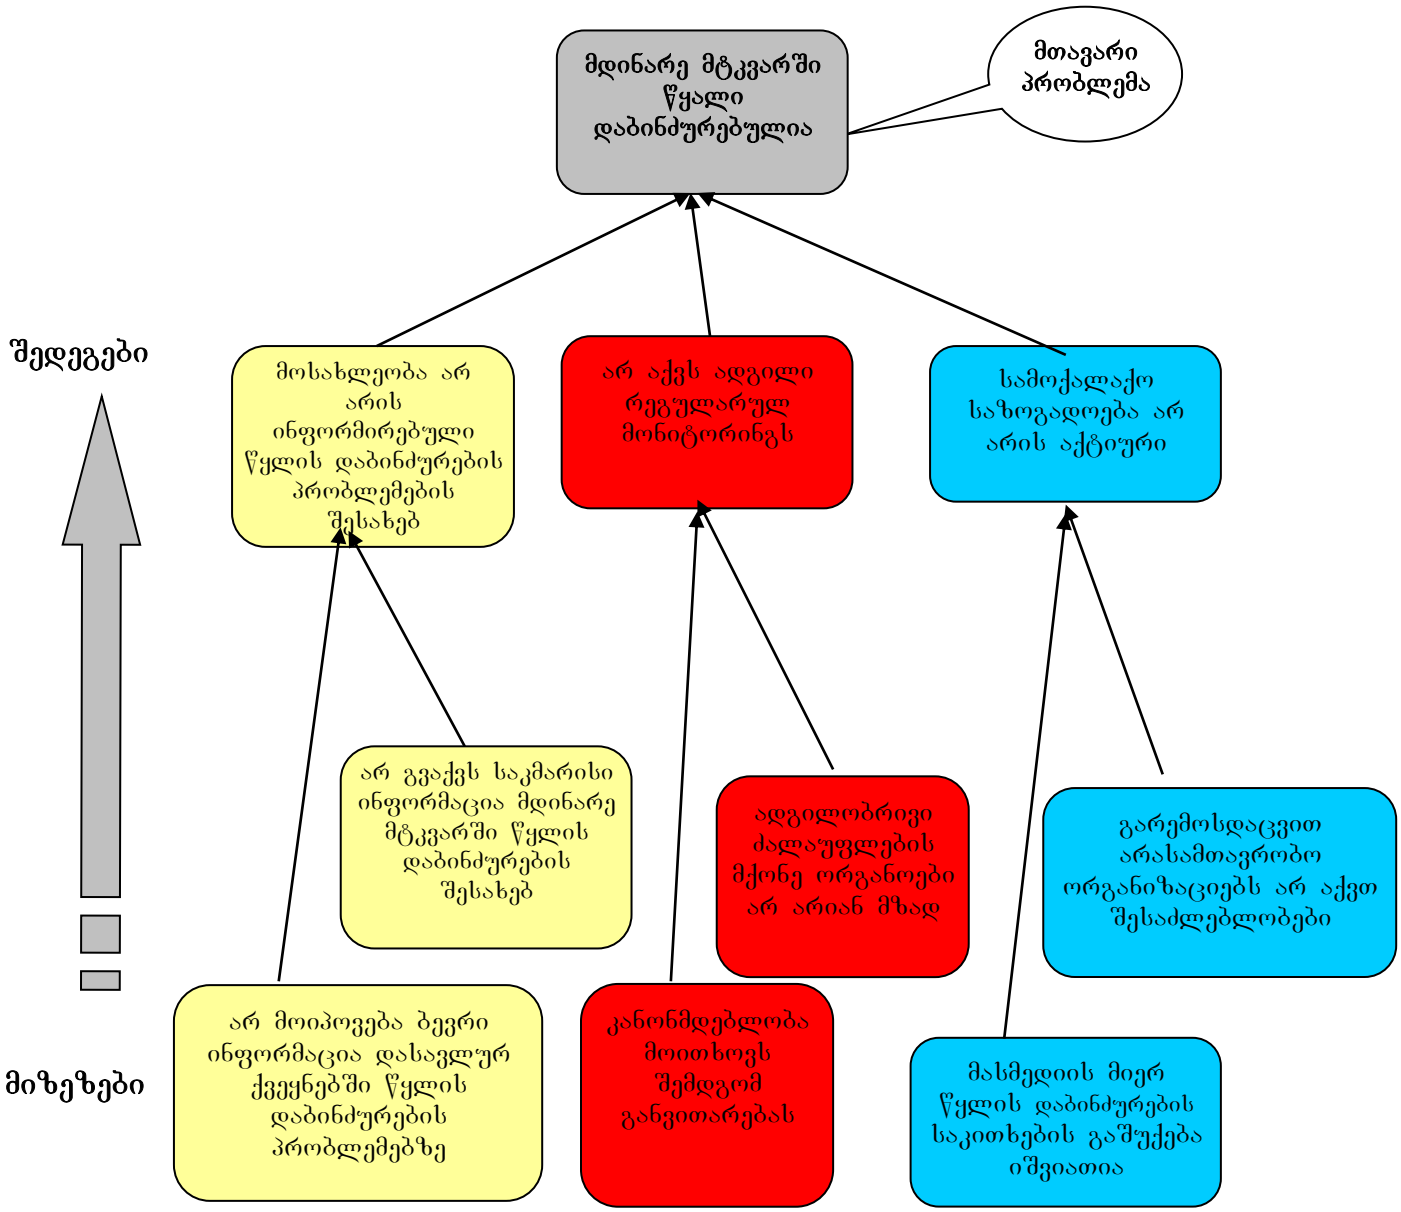

<u>მიზნების ხე</u>

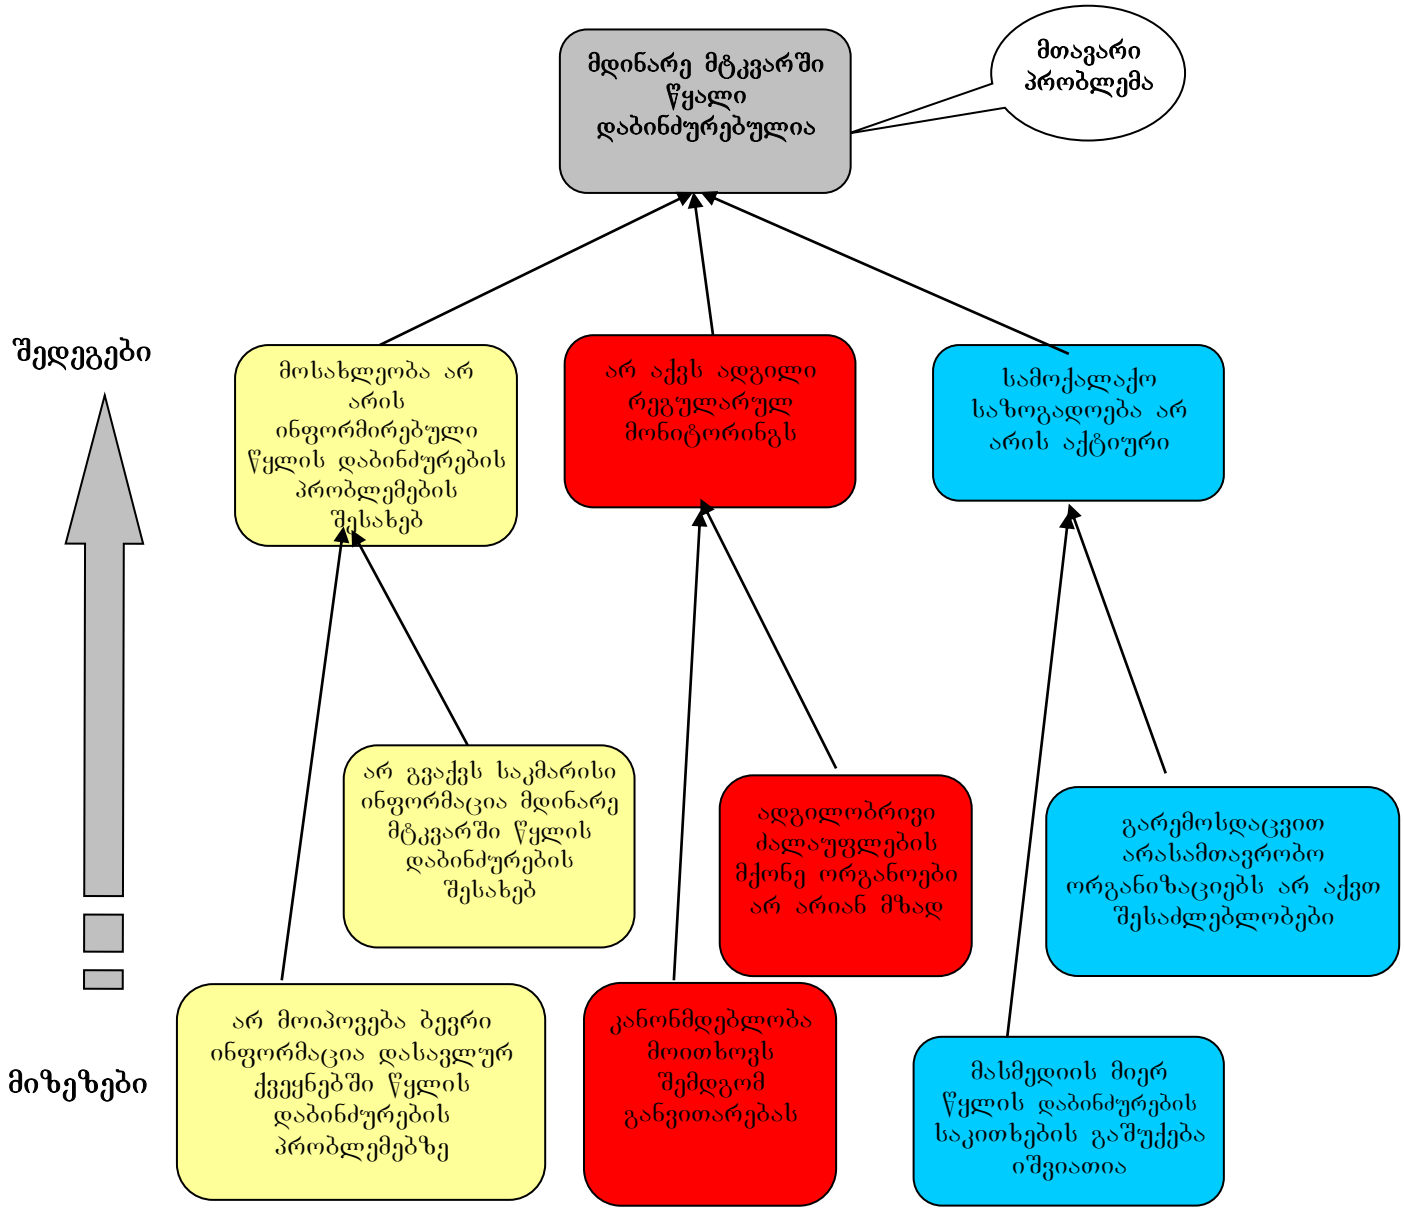

5.2 შედეგების განსაზღვრა

შედეგი არის ხელშესახები რამ, რის შექმნასაც პროექტი მიზნად ისახავს. მაგ: თუ პროექტის ეხება სახლის აშენებას, მაშინ პროექტის მიზანი იქნება **სახლის აშენება,** მაშინ როცა პროექტის შედეგი იქნება **აშენებული სახლი.**

6 რისკები

რისკი არის მოულოდნელი მოვლენა, რომელმაც შესაძლოა პროექტის მიზნების შეუსრულებლობა გამოიწვიოს.

რისკის მენეჯმენტი არის პოტენციური რისკების იდენტიფიცირების, მათი პროექტზე გავლენის შეფასების, ნეგატიური ზემოქმედების მაქსიმალურად შემცირების გეგმის შემუშავებისა და დანერგვის პროცესი

6.1 რისკის მენეჯმენტი

რისკის მენეჯმენტის ციკლი

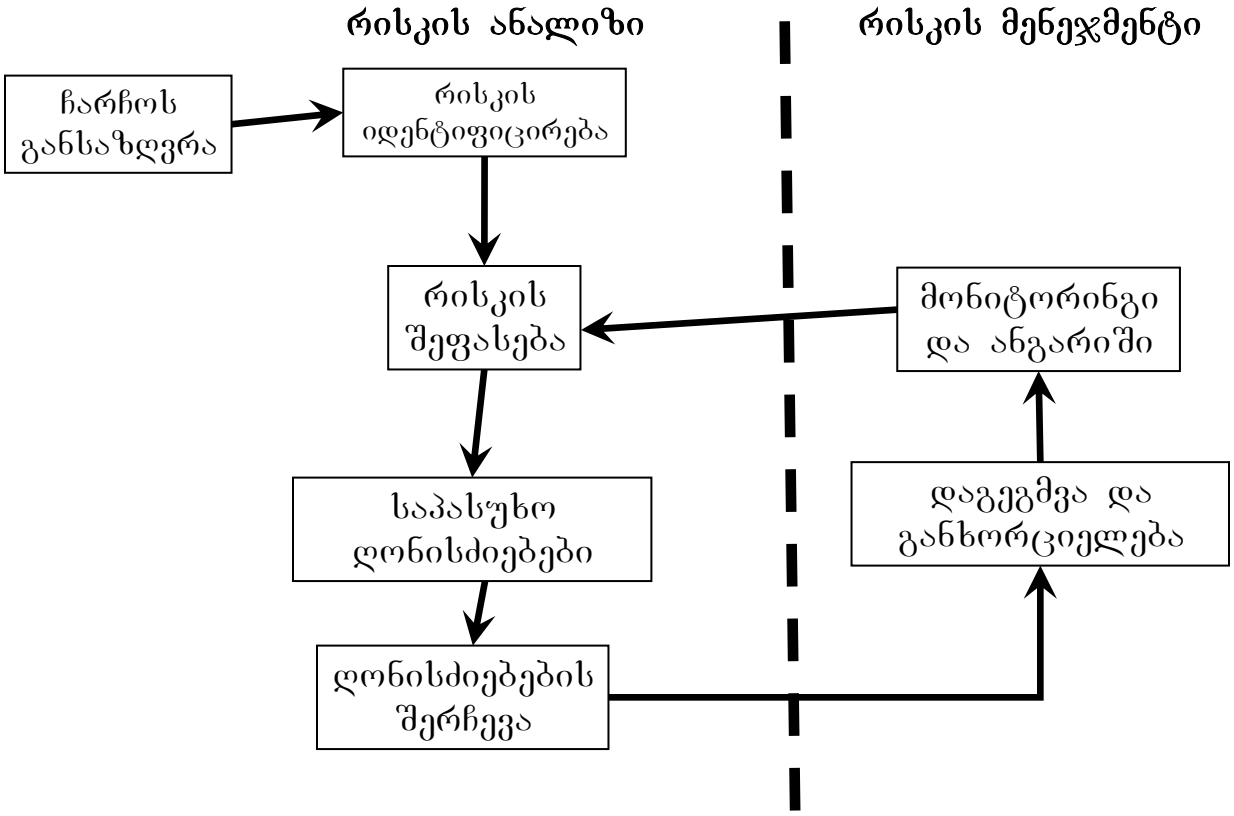

6.2 როგორ განვსაზღვროთ პოტენციური რისკები

- მსგავსი პროექტების პრობლემებთან გაცნობა
- ბრეინსტორმინგი ექსპერტებსა და სხვა გამოცდილ ადამიანებთან

6.3 ალბათობა-გავლენის მატრიცა

ალბათობა					
თითქმის გარდაუვალი	M	M	H	H	H
მოსა-ლოდნელ	L	M	M	H	H
სავარა-უდო	L	M	M	H	H
ნაკლებად სავარაუდო	L	L	L	M	H
შორეული	L	L	L	L	M
	ძალიან მცირე	მცირე	საშუალო	მაღალი	კრიტიკული
	გავლენა				

L – დაბალი; M – საშუალო; H – მაღალი

6.4 რისკების მენეჯმენტის სტრატეგია

- შემცირება
- თავიდან აცილება
- მიღება

7 ლოგიკური ჩარჩოს მიდგომა და ლოგიკური მატრიცა

ლოგიკური ჩარჩოს მიდგომა წარმოადგენს მეთოდოლოგიას და იარაღს პროექტის დაგეგმვის და მენეჯმენტის მხარდასაჭერად. ლოგიკური ჩარჩოს მიდგომის გაომყენება (მიზნებზე ორიენტირებული პროექტის დაგეგმვა (GOPP), ამოცანებზე ორიენტირებული პროექტის დაგეგმვა, (OOPP), მიზნებზე ორიენტირებული პრგრამის დაგეგმვა (GOPP), მიზნებზე ორიენტირებული მონაწილეობის დაგეგმვა (GOPP)) პროექტის განვითარების ფაზაში კარგად ნაცნობი პრაქტიკაა.

ორგანიზაციების უმრავლესობამ მხოლოდ ახლა გაითავისა ეს მიდგომა, რომელიც ჯერ კიდევ 1970-იან წლებში შეიქმნა.

ლოგიკური ჩარჩო არის მარტივი ინსტრუმენტი, რომელსაც ვიყენებთ იმ იდეების ფორმულირებისა და სტრუქტურირებისთვის, რომლებიც თავდაპირველი დაგეგმვის ფაზაში წარმოიქმნება. ესენია: პროექტის პრიორიტეტები, სავარაუდო შედეგები და ღონისძიებები. ლოგიკური ჩარჩოს პრინციპის გამოყენებით პროექტი უფრო გასაგები ხდება.
ამ მიდგომის ძლიერი მხარე არის მისი უნარი ასახოს როგორ განვითარდება პროექტი მიზნებიდან ღონისძიებამდე. ის, ასევე, ხელს უწყობს წარმატების კონკრეტული ინდიკატორების განსაზღვრას და, შესაბამისად, ხდება ძლიერი ინსტრუმენტინ განვითარების ნებისმიერ საფეხურზე პროექტის სტატუსის დაფიქსირებისთვის და მყარი საფუძველი მისი საბოლოო შეფასებისთვის.

7.1 ლოგიკური მატრიცა

ლოგიკური მატრიცა არის ოთხ სვეტიანი და ოთხ სტრიქონიანი ვიზუალური საშუალება (დოკუმენტი), რომელიც ასახავს პროექტის ძირითად კომპონენტებს, მათ სტრუქტურასა და ერთმანეთთან კავშირს.

	ნარატიული ნაწილი	ობიექტურად შემოწმებად ინდიკატორი	შემოწმების საშუალებები	ვარაუდები
ძირითადი მიზანი				
პროქტის მიზანი				
შედეგები				
ღონისძიებები				
				წინაპირობები

ლოგიკური მატრიცის გამოყენების უპირატესობებია:

1. გვიჩვენებს რამდენად წარმატებული იქნება პროექტი
2. გვიჩვენებს კავშირს ღონისძიებებსა და მათ მოსალოდნელ შედეგებს შორის
3. მიმდინარეობის და წარმატების ინდიკატორების გამოყენება პროექტის შეფასება უფრო მარტივი ხდება
4. ემსახურება ინფორმაციის გაცვლას გასაგებად და ზუსტად
5. ხაზს უსვამს გამორჩენილ კავშირებს, წინააღმდეგობებს პროექტის დიზაინში

ლოგიკური ჩარჩოს გამოყენება უზრუნველყოფს პროცესის სრულყოფილ სურათს, რომელიც მოიცავს პროექტის შესაძლო ან მოსალოდნელ შედეგს.

მიუხედავად იმისა, რომ ლოგიკური ჩარჩო ბრწყინვლე ინსტრუმენტია პროექტის დაგეგმვისათვის, იგი მაინც ვერ ჩაანაცვლებს დეტალურ მომზადებას. ლოგიკური ჩარჩო ცხადყობს პროექტის დაგეგმვის პროცესში დაშვებულ შეცდომებს, თუმცა არ შეუძლია ამ შეცდომების გამოსწორება. არსებული მდგომარეობის, პრობლემების, შესაძლებლობების, პოტენციური სამიზნე აუდიტორიის, შესაძლო პარტნიორების, პროექტისთვის დაფინანსების რესურსების და ა.შ. ანალიზი არის ნებისმიერი პროექტის პირველი საფეხური.

7.1.1 ლოგიკური ჩარჩოს მატრიცის დასრულება

<u>1. პროექტის ნარატიული შეჯამების დაწერა</u>

პროექტის განვითარების პირველი საფეხურია ნარატიული ნაწილის მომზადება პროექტის მიზნების და ღონისძიებების შესახებ. ქვემოთ მოცემული ცხრილის პირველი სვეტი აღწერს მიზნებს და ღონისძიებებს ლოგიკური თანმიმდევრობით:

- პროექტის მიზნები, რომელიც ასახავენ სასურველ სამომავლო მდგომარეობას მიმართულს უფრო ზოგადიდან სპეციფიურისკენ
- მიზნის მიღწევის საშუალებები

	<u>ნარატიული ნაწილი</u>	ობიექტურად შემოწმებადი ინდიკატორები	შემოწმების საშუალებები	ვარაუდები
ძირითადი მიზანი				
პროექტის მიზანი				
შედეგები				
ღონისძიებები				
				წინაპირობები

7.1.2 საერთო მიზანი

პროექტის საერთო მიზანი იმ შორეულ მიზანზე მიუთითებს, რომლის მიღწევას თუ შენარჩუნებას ემსახურება პროექტი. პროექტის ზოგადი მიზნები უკავშირდებიან ორგანიზაციის მიზნებს ან გეოგრაფიულ არეალს.

ზოგჯერ უფრო ადვილია ზოგადი მიზნის ფორმულირება, მას შემდეგ, რაც უკვე ცნობილია პროექტის მიზანს. თუ საერთო მიზნის ფორმულირება არ ან რთულად ხერხდება, შესაძლებელია მისი დროებით ღიად დატოვება და მოგვიანებით დაბრუნება. შემდეგ კითხვებზე პასუხის გაცემამ შეიძლება გაამარტივოს პროექტში საერთო მიზნის განსაზღვრა:

- ორგანიზაციის რომელი მიზნის საფუძველზე განვითარდება პროექტი?
- ორგანიზაციის რა სპეციფიურ მიზნებს მიყვება პროექტი?
- რა წვლილს შეიტანს პროექტი ამ მიზნების მიღწევაში?

7.1.3 პროექტის მიზანი

პროექტის საერთო მიზანი არის კონკრეტული რამ, რის მიღწევასაც ისახავს პროექტი მიზნად. პროექტის მიზანი ცხადყოფს რატომ სურს განმახორციელებელ გუნდს პროექტის განხორცილება და აჯამებს იმ შედეგებს, რაც უნდა ჰქონდეს პროექტს. ჩვეულებრივ, მიზანი ასევე აღწერს იმას, თუ როგორ გავლენას მოახდენს პროექტი სამიზნე ჯგუფსა თუ სხვა ბენეფიციარებზე.

პროექტს, როგორც წესი, ერთი ან ორი მიზანი აქვს. დაიმახსოვრეთ: მიზანების რაოდენობის შეზღუდვა გვეხმარება ფოკუსის შენარჩუნებაში.

პროექტის კარგი მიზანი უნდა იყოს:

- აუცილებელი: პროექტის მიზანი უნდა მოერგოს მისიის თუ ინსტიტუციის მანდატს და სტრატეგიებს
- რეალისტური: ამ მიზნის მიღწევა შესაძლებელი უნდა იყოს
- შეთანხმებული უნდა იყოს: ყველა მონაწილე პროექტის მხარდასაჭერად შეთანხმებული უნდა იყოს

გამოიყენეთ შემდეგი კითხვები პროექტის კონკრეტული მიზნის განსაზღვრისთვის:

- რა უნდა შესარულოს პროექტმა?
- რა გამართლება აქვს პროექტს?
- როგორ გავლენას მოახდენს პროექტის ამჟამინდელ სიტუაციაზე?
- რას მოუტანს ის ბენეფიციარებს?

7.1.4 პროექტის შედეგები

შედეგები მატრიცაში აღწერს იმას, რაც უნდა შეიქმნას პროექტის დასრულების შემდეგ. შესაძლოა ითქვას, რომ პროექტი წარმატებულია, თუ ყველა მოსალოდნელი შედეგი მიღწეულ იქნა.

ამ გრაფაში ჯამდება ის, რის მიღწევასაც ისახავს პროექტის გუნდი მიზნად და თუ მიიღო მიიღო გუნდმა ის რესურსები, რომელიც სჭიდებოდა ამ მიზნის მიღწევას.

შემდეგ კითხვებზე პასუხის გაცემა დაგვეხმარება პროექტის მოსალოდნელი შედეგები განვსაზღვროთ:

- რას მივიღებთ პროექტის დასრულების შემდეგ?

- რა მიზნებს მიაღწევს ან შეინარჩენებს პროექტი?
- რა პირობების წინაშე დგას პროექტი?

7.1.5 პროექტის ღონისძიებები

ღონისძიებები განსაზღვრავს, თუ როგორ აპირებს პროექტის გუნდი პროექტის განხორციელებას. ღონისძიებები წარმოადგენს იმ აქტივობების მოკლე აღწერას, რომელითაც თითოეული შედეგი მიიღწევა. მიუთითეთ უნდა იქნას ვინ არის პასუხისმგებელი თითოეულ ღონისძიებაზე.

შემდეგ კითხვებზე პასუხის გაცემა დაგვეხმარება იმ აქტივობების განსაზღვრაში, რომელსაც პროექტი უნდა მოიცავდეს:

- როგორ განახორციელებს პროექტს გუნდი?
- რა საფეხურები და რა თანმიმდევრობაა საჭირო თიოთოეული შედეგის მისაღწევად?
- თუ უკვე არსებობს, ინდივიდუალური სამუშაოს გეგმები და ოპერაციის ზოგადი გეგმა რა დავალებებს მოითხოვს?

7.2 პროექტის წარმატების შემოწმების კრიტერიუმის არჩევა

ლოგიკური მატრიცის მეორე სვეტი გვაძლევს საშუალებას განვსაზღვროთ პროექტის **ობიექტურად შემოწმებადი ინდიკატორები**.

	ნარატიული ნაწილი	**ობიექტურად შემოწმებადი ინდიკატორები**	შემოწმების საშუალებები	ვარაუდები
ძირითადი მიზანი				
პროექტის მიზანი				
შედეგები				
ღონისძიებები (აქტივობები)				
				წინაპირობები

ობიექტურად შემოწმებადი ინდიკატორები აღწერენ იმ საფუძვლებს, რომელზე დაყრდნობითაც განისაზღვრება პროექტის პროგრესი და წარმატებები. ობიექტურად შემოწმებადი ინდიკატორები ოთხ ელემენტს მოიცავენ:

- დროის პერიოდი:

რა დროისთვის ან რა პერიოდში უნდა მიაღწიოს პროექტმა გარკვეულ შედეგს ან შეასრულოს დაგეგმილი ღონისძიება?

- მდებარეობა

სად ჩატარდება ღონისძიება ან მოხდება შედეგის მიღწევა?

- ხარისხი:

რა მინიმუმალურ სტანდარტებს უნდა აკმაყოფილებდეს ღონისძიება ან შედეგი?

- რაოდენობა:

რამდენჯერ უნდა განხორციელდეს ეს ღონისძიება ან შედეგის მიღწევა?
განვსაზღვროთ ობიექტურად შემოწმებადი ინდიკატორები მატრიცის თითოეულ რიგში: საერთო მიზანი, პროექტის მიზანი, შედეგები და ღონისძიებები. პროექტისთვის ავირჩიოთ ინდიკატორები, რომლებიც აკმაყოფილებენ ვალიდურობის შემდეგ კრიტერიუმებს:

- არსებითობა

ინდიკატორები უნდა ეხებოდეს პროექტის ძირითად არსს

- მიღწევადობა

ინდიკატორები უნდა იყოს მიღწევადი

- მიზანზე ორიენტირებულობა

პროექტის თითოეული მიზანს უნდა გააჩნდეს საკუთარი განსაზღვრული ინდიკატორი

- დამოუკიდებლობა

სხვადასხვა ინდიკატორს არ შეიძლება ჰქონდეს ერთიდაიგივე კრიტერიუმი ან საკითხი.

შემდეგ კითხვებზე პასუხის გაცემა დაგვეხმარება პროექტის წარმატების განმსაზღვრელი ვალიდური კრიტერიუმების ჩამოყალიბებაში:

- რა გვიჩვენებს იმას, რომ პროექტმა მიაღწია მოსალოდნელ შედეგებს?
- როდის ჩათვლით რომ მიზანი წარმატებით განხორციელდა?

7.3. შემოწმების საშუალებების განსაზღვრა

შემოწმების საშუალებები ასახავენ, თუ რა სახის ინფორმაციის წყარო იქნება გამოყენებული პროექტის მიღწევების პროგრესის შესაფასებლად.

მას შემდეგ, რაც განისაზღვრა პროექტის პროგრესისა და წარმატების შემოწმების საფუძვლები, აუცილებლად უნდა ჩამოყალიბდეს დამტკიცების ის საშუალებები, რომლებსაც გამოვიყენებული იქნება.

	ნარატიული ნაწილი	ობიექტურად შემოწმებადი ინდიკატორები	**შემოწმების საშუალებები**	ვარაუდები
ძირითადი მიზანი				
პროექტის მიზანი				
შედეგები				
ღონისძიებები (აქტივობები)				
				წინაპირობები

მიუთითეთ რა სახის ინფორმაციას იქნება გამოიყენებული წარმატების თითოეული ინდიკატორის მიღწევის დასამტკიცებლად. შემოწმების ვალიდური საშუალებები გვიჩვენებენ:

- რა ინფორმაცია გვჭირდება
- ფორმატი რომლითაც ინფორმაცია იქნება წარმოდგენილი
- სად არის კონკრეტული ინფორმაცია ან ვის აქვს იგი

შემდეგ კითხვებზე პასუხის გაცემა დაგვეხმარება შემოწმების ვალიდური საშუალებების დადგენაში:

- რა ფაქტი მიუთითებს იმაზე, რომ მიზნები მიღწეულ იქნა?
- ინფორმაციის რა წყაროები არსებობს?
- რა სახის ან ტიპის მტკიცებულებაა ეს?
- სად არის ამ ტიპის ინფორმაციის მოძიება შესაძლებელი?

7.4 მნიშვნელოვანი ვარაუდების და წინაპირობების ჩამოყალიბება

	ნარატიული ნაწილი	ობიექტურად შემოწმებადი ინდიკატორები	შემოწმების საშუალებები	**ვარაუდები**
ძირითადი მიზანი				
პროექტის მიზანი				
შედეგები				
ღონისძიებები (აქტივობები)				
				წინაპირობები

7.4.1 მნიშვნელოვანი ვარაუდები

ვარაუდები არის გარეგანი ფაქტორები, რომლებსაც შეუძლიათ ზემოქმედება იქონიონ პროექტზე და რომელზეც პირდაპირი კონტროლის საშუალება არ არსებობს.

თქვენ პროექტის სრული სურათი არ გექნებათ მანამ, სანამ არ განსაზღვრავთ იმ ფაქტორებს, რომლებიც თქვენს კონტროლს მიღმაა, მაგრამ მნიშვნელოვანია პროექტის შედეგების მიღწევისთვის. ასეთი ფაქტორების წინასწარი ზუსტი განსაზღვრა ძალიან მნიშვნელოვანია. იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე ვარაუდს ადგილი არ ჰქონდა, აუცილებლად უნდა გადაიხედოს ლოგიკური მატრიცა და მოხდეს მისი განახლება.

არსებობს ე.წ. მკვლელი ვარაუდები (**Killer Assumptions**). მკვლელი ვარაუდები გვიჩვენებენ, რომ პროექტის რომელიმე მიზანი ვერავითარ შემთხვევაში ვერ განხორციელდება.
აუცილებელია პროექტში მკვლელი ვარაუდების რიცხვის ნულამდე დაყვანა. ამისათვის შესაძლოა საჭირო გახდეს პროექტის ამოცანების ან მათI განხორციელების გზების შეცვლა. სამწუახაროდ, თუ არ არსებობს მკვლელი ვარაუდების ნულამდე დაყვანის შესაძლებლობა, პროექტის განხორციელებაზე უარი უნდა ითქვას. სხვა შემთხვევაში დახარჯული ენერგია და ძალისხმევა სრულიად ფუჭი და უსარგებლო იქნება.

შემდეგ კითხვებზე პასუხის გაცემა დაგვეხმარება იმ მნიშვნელოვანი ვარაუდების განსაზღვრაში, რომლებზეც პროექტის წარმატებაა დამოკიდებული:

- არსებობს რაიმე, რაც გათვალისწინებულ უნდა იქნას და რისი გაკონტროლებაც შეუძლებელია?
- სჭირდება თუ არა რაიმე პროექტს ისეთი, რისი უზრუნველყოფაც არ შეგიძლიათ?
  - რა უნდა მოხდეს დაგეგმილი ღონისძიებების ჩატარებასთან ერთად, იმისათვის, რომ მოხდეს პროექტის მიზნებს მიღწევა?
  - ხომ არ ჰქონდა ადგილი ვარაუდების ცვლილებას ან მათ საერთოდ არ მოხდენას?
  - ხომ არ არსებობს აუცლებელი პირობებიდან რომელიმეს არ შესრულების ალბათობა?

7.5 წინაპირობები

გარდა მნიშვნელოვანი ვარაუდებისა უნდა განისაზღვროს წინაპირობები. წინაპირობები არის წინასწარ არსებული გარემოებები, რომლებიც პროექტის დაწყებამდე უნდა არსებობდეს. ასეთი წინაპირობების არ არსებობა უარყოფით გავლენას მოახდენს პროექტზე.

წინაპირობები შეიძლება უკავშირდებოდეს:

- ადამიანურ ფაქტორებს
- სახსრებთან ხელმისაწვდომობას
- დამტკიცების პროცესს

მთავარი კითხვა, რომელსაც წინაპირობებთან დაკავშირებით უნდა გაეცეს პასუხი არის: რა ფაქტორები <u>უნდა</u> არსებობდნენ აუცილებლად პროექტის დაწყებამდე?

	<u>ნარატიული ნაწილი</u>	ობიექტურად შემოწმებადი ინდიკატორები	შემოწმების საშუალებები	ვარაუდები
ძირითადი მიზანი				
პროექტის მიზანი				
შედეგები				
ღონისძიებები (აქტივობები)				
				წინაპირობები

7.6 პროექტის დიზაინის დამტკიცება/გადამოწმება

ამ ეტაპზე ლოგიკური ჩარჩოს მატრიცა უკვე შეიცავს პროექტის ყველა ელემენტს. სხვა საკითხებზე გადასვლის წინ, უნდა შემოწმდეს ხომ არ შეიცავს პროექტის გეგმა რაიმე უზუსტობას.

რადგანაც მატრიცა ეფუძნება მიზეზისა და შედეგის კონცეფციას (თუ რაიმე მოვლენას აქვს ადგილი, მაშინ შესაძლოა სხვა რამეც მოხდეს), ადვილია ის კავშირები აღმოვაჩინოთ, რომლებიც არ იქნა აღმოჩენილი.

წაიკითხეთ მატრიცა ბოლოდან ზევით (როგორც მაგალითშია მოცემული) რათა მოხდეს შეცდომების აღმოჩენა:

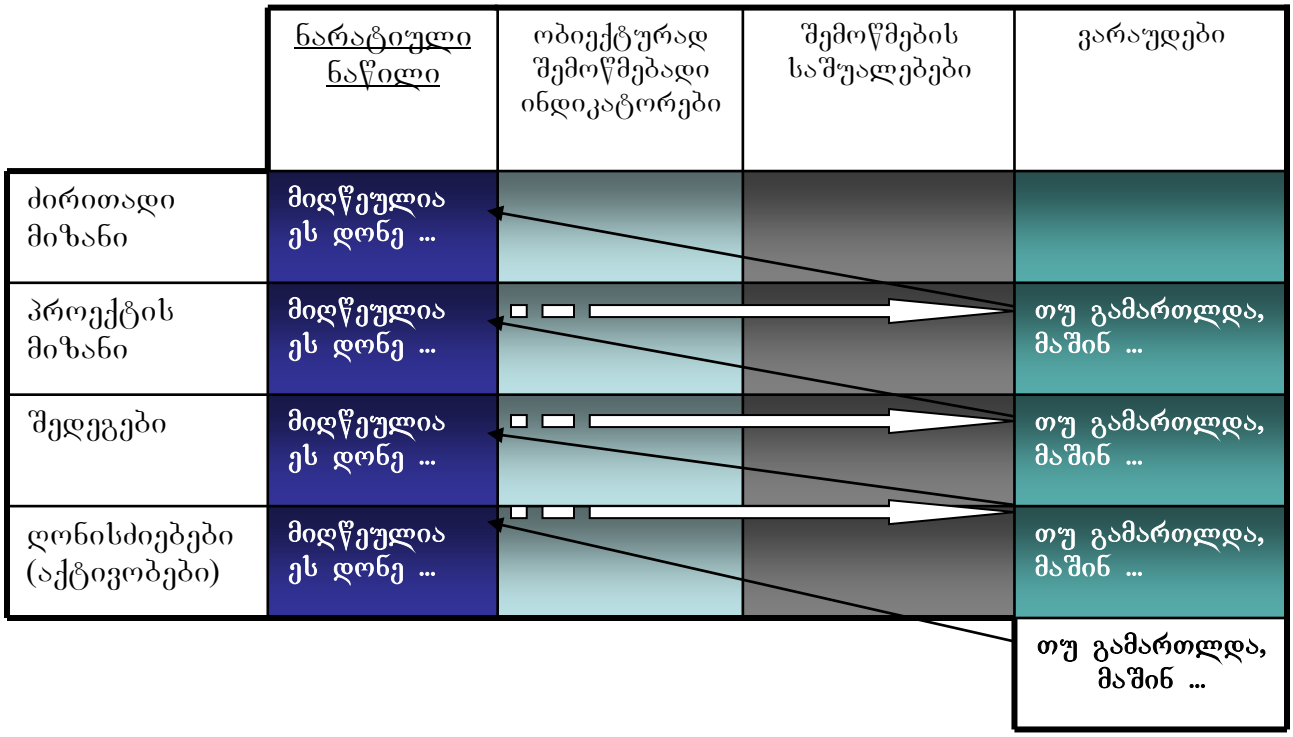

თუ პროექტი საკმირისად თანმიმდევრული და მყარია, მაშინ მას შემდეგ რაც ყველა ღონისძიება და მდგომარეობა ქვედა რიგში მთლიანად დასრულებულია უნდა ხდებოდეს ზედა მიზნებისკენ გადანაცვლება.

საბოლოოდ შეამოწმეთ რისკები და დარწმუნდით, რომ პროექტის მიზნები მიღწევადია. მხოლოდ ამ საბოლოო შემოწმების შემდეგ შეიძლება პროექტის შინაარსი სრულად შემუშავებულად ჩაითვალოს.

კვლავ დაუსვით საკუთარ თავს შემდეგი კითხვები:

- არის თუ არა პროექტის მიზანი ორგანიზაციის მიზნებთან შესაბამისობაში?
- მიგვიყვანს თუ არ პროექტის განხორციელება არსებული მდგომარეობის მნიშვნელოვან გაუმჯობესებასთან? ექნება თუ არა პროექტს დადებითი გავლენა არსებულ მდგომარეობაზე?

- ეხება თუ არა პროექტის მიზანი ქვეყნის ან რეგიონის რაიმე სფეციფიურ საჭიროებებს?
- არის თუ არა პროქტის მიზანი შემავსებელი სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების თუ ადგილობრივი სექტორის მიერ გატარებული ღონისძიებებისა? თუ არა, დაგეგმილია თუ არა მსგავსი ინიციატივები?
- აქვს თუ არა პროექტის გუნდს შესაბამის რეგიონებში და საკითხების ირგვლივ მუშაობის საკმარისი გამოცდილება?
- პროექტისთვის საჭირო დროისა და საჭირო რესურსების მხრივ, არის თუ არა ხარჯების და სარგებლის ანალიზი დადებითი?
- თქვენი ორგანიზაციის ჩართვა გაადვილებს თუ არა დასახული მიზნის მიღწევას?
- არსებობს თუ არა რეალური ბიუჯეტი მიზნის მიღწევისთვის?
- არსებობს თუ არა საკმარისი და შესაბამისი გამოცდილების მქონე პერსონალი მიზნის მისაღწევად?
- არის თუ არა საკმარისი დრო მიზნის მიღწევისთვის?
- არის თუ არა ზუსტად განსაზღვრული როდის დასრულდება თქვენი მონაწილეობა პროექტში?
- არსებობს თუ არა დაგეგმილი ღონისძიებები მიღწეული მიზნის სიცოცხლისუნარიანობისა და მდგრადობის შესანარჩუნებლად
- თუ ეს ეხება ამ პროქტს, მოუტანს თუ არა რაიმე სარგებელს დაბალ შემოსავლიან და მოწყვლად კატეგორიას?

პრობლემის ხე

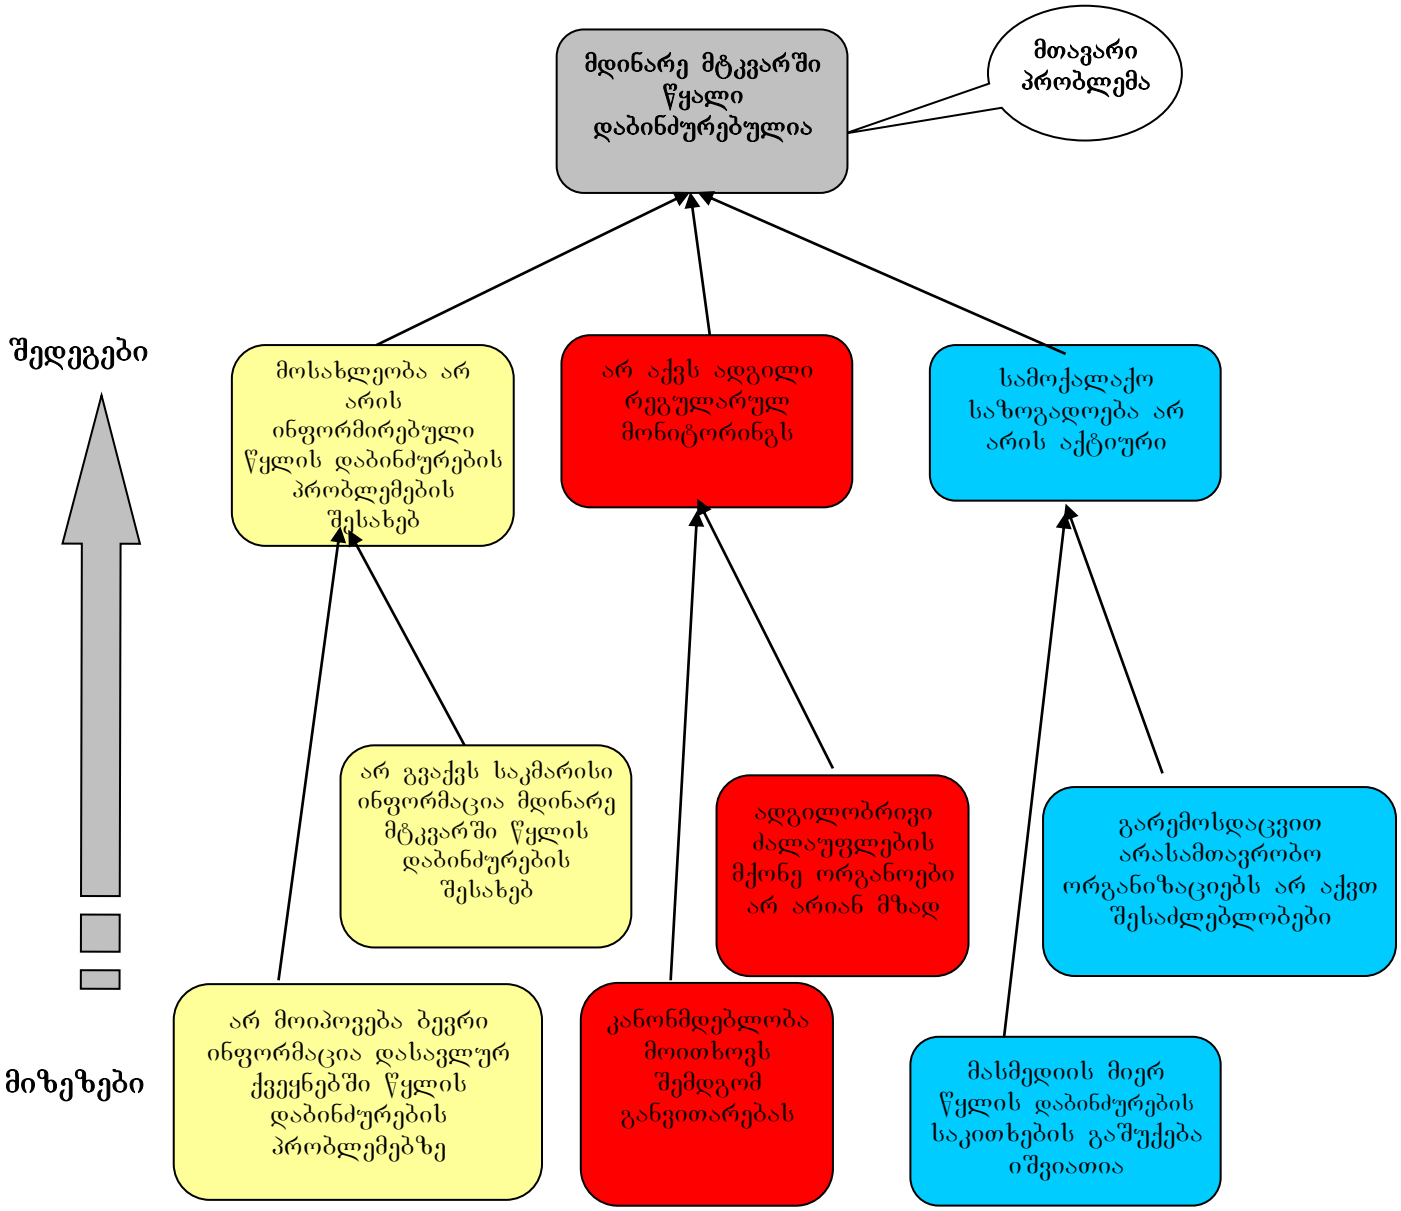

მიზნების ხე

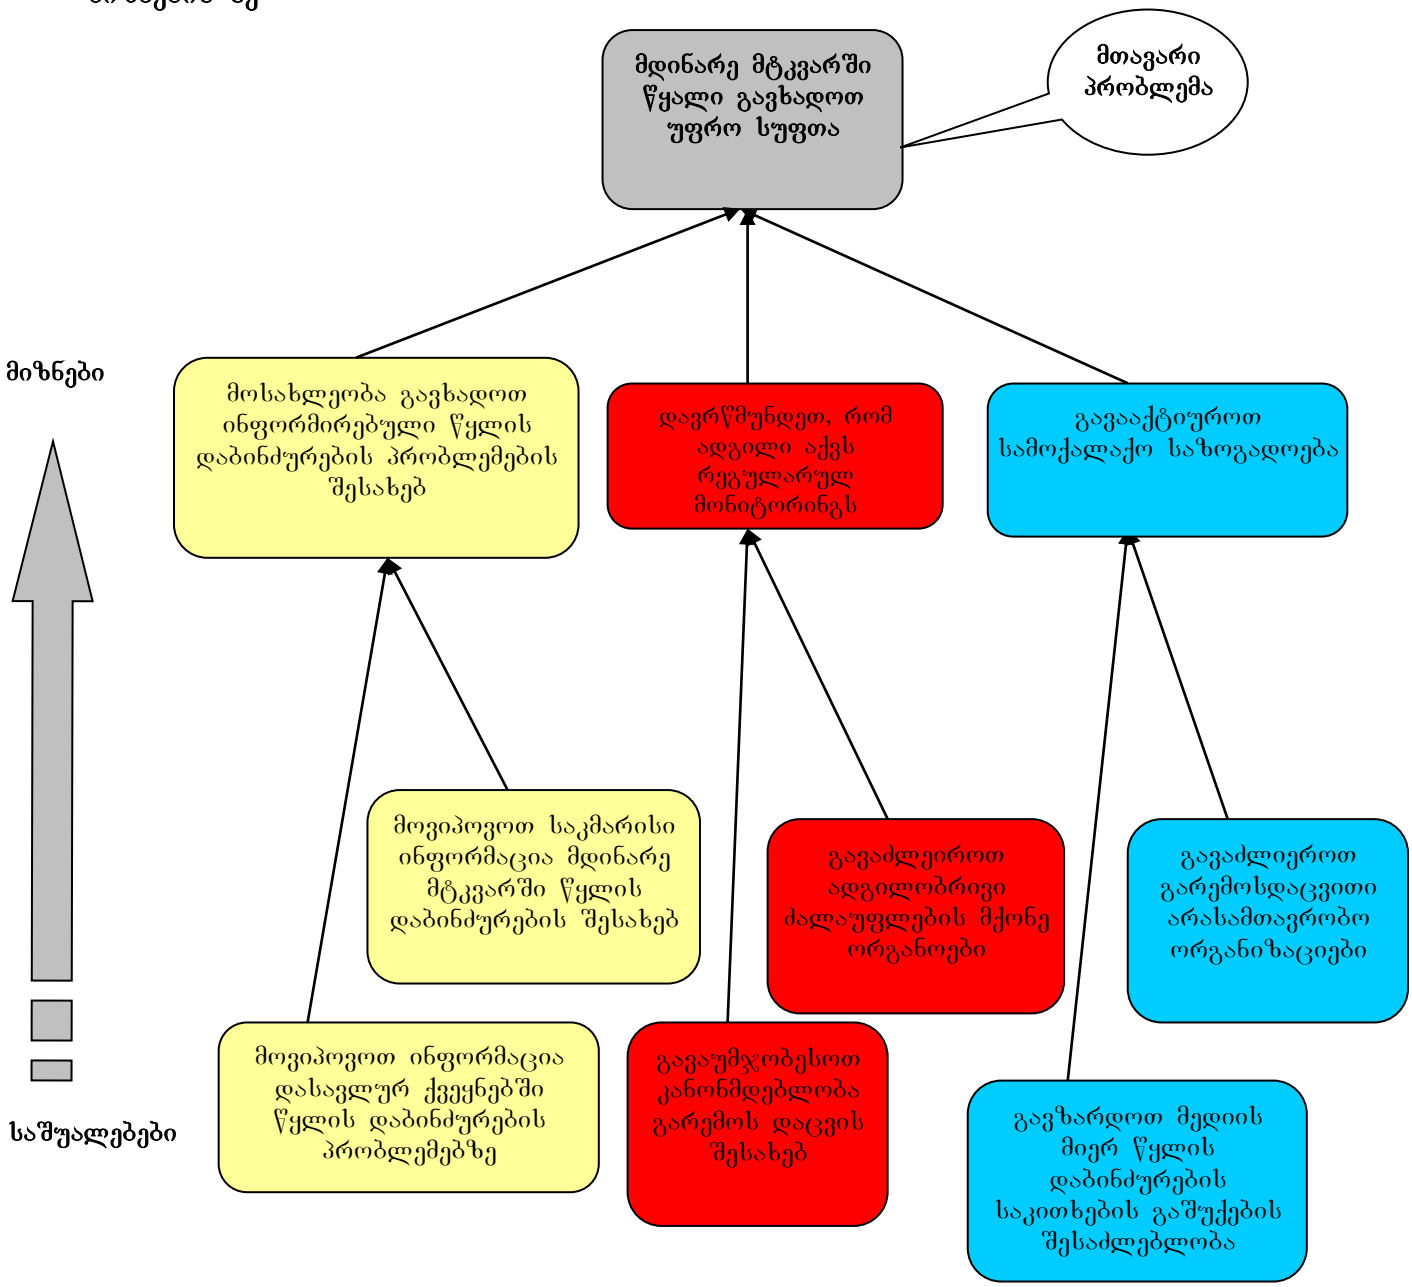
მდინარე მტკვარში წყალი გავხადოთ უფრო სუფთა
მთავარი პრობლემა
მიზნები
მოსახლეობა გავხადოთ ინფორმირებული წყლის დაბინძურების პრობლემების შესახებ
დავრწმუნდეთ, რომ ადგილი აქვს რეგულარულ მონიტორინგს
გავააქტიუროთ სამოქალაქო საზოგადოება
მოვიპოვოთ საკმარისი ინფორმაცია მდინარე მტკვარში წყლის დაბინძურების შესახებ
გავაძლეიროთ ადგილობრივი ძალაუფლების მქონე ორგანოები
გავაძლიეროთ გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციები
მოვიპოვოთ ინფორმაცია დასავლურ ქვეყნებში წყლის დაბინძურების პრობლემებზე
გავაუმჯობესოთ კანონმდებლობა გარემოს დაცვის შესახებ
გავზარდოთ მედიის მიერ წყლის დაბინძურების საკითხების გაშუქების შესაძლებლობა
საშუალებები

	ნარატიული ნაწილი	ობიექტურად შემოწმებადი ინდიკატორი	შემოწმების საშუალებები	ვარაუდები
ძირითადი მიზანი	- მდინარე მტკვარში წყალი გავხადოთ უფრო სუფთა	- პროექტის ბოლოს მტკვრის მიმდებარე ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობა ინფორმირებული იქნება წყლის დაბინძურების შესახებ	- ადგილობრივი მოსახლეობის მონახულება - რეგიონული გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან მიღებული ანგარიშები	- რეგიონული გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციები მოდიან თანამშრომლობაზე
პროექტის მიზანი	- მოსახლეობა გავხადოთ ინფორმირებული წყლის დაბინძურების პრობლემების შესახებ	- პროექტის ბოლოს 1,500,000 ადამიანი იქნება ინფორმირებული მდინარე მტკვარში წყლის დაბინძურების შესახებ	- ადგილობრივი მოსახლეობის მონახულება - რეგიონული გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან მიღებული ანგარიშები	- ადგილობრივი მედია ხელმისაწვდომია - რეგიონული გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციები მოდიან თანამშრომლობაზე
შედეგები	- საზოგადოების ინფორმირებულობის კამპანიას ადგილი ექნება მდინარე მტკვრის ნაპირზე - მოხდება დასავლეთი პრაქტიკის კვლევა წყლის დაბინძურების პრობლემების შესახებ და ეს შედეგები მოხმარდება საზოგადოების ინფრომირებას	- საზოგადოების ინფორმირებულობის კამპანიის 6 თვის განმავლობაში სატელევიზიო რეკლამის 5 ტიპი იქნება ნაჩვენები 5 მთავარ არხზე, თითოეული 1000-ჯერ - საზოგადოების ინფორმირებულობის კამპანიის 6 თვის განმავლობაში 3 ტიპის ბუკლეტი და 3 ტიპის პლაკატი დაურიდგება 350 სკოლას, 150 ინსტიტუტს და 550 ადგილობრივ მოსახლეს	- მედია კლიპინგი (Media clipping) - ადგილობრივი მოსახლეობის, სკოლების და ინსტიტუტების მონახულება	- ადგილობრივი მოსახლეობა, სკოლები და ინსტიტუტები თანამრომლობაზე მოდიან - ადგილობრივი მედია ხელმისაწვდომია
ღონისძიებები	- გარემოსდაცვის სამინისტრო ჩაატარებს დასავლეთის საუკეთესო პრაქტიკის კვლევას წყლის დაბინძურების პრობლემების შესახებ - გარემოსდაცვის სამინისტრო გამოაცხადებს ტენდერს სატელევიზიო სარეკლამო მომსახურებაზე - გარემოსდაცვის სამინისტრო მოაწყობს ტენდერს წყლის დაბინძურების თემაზე ბუკლეტის და პლაკატის გამოსაშვებად - რეკლამები გავა ეროვნულ და ადგილობრივ სატელევიზიო არხებზე - პლაკატები და ბუკლეტები დარიგდება სკოლებში, უნივერსიტეტებსა და მტკვრის მიმდებარე ტერიტორიაზე	- 2006 წლის 30 ივლისთვის კითხვარები დაეგზავნებათ პარტნიორ სამთავრობო სტრუქტურებს - 2006 წლის 31 ივლისს მიღებული იქნება შევსებული კითხვარები - 2006 წლის 15 ოქტომბრისთვის რეკლამების, ბუკლეტების და პლაკატების კრიტერიუმები შემუშავებული და ტენდერი გამოცხადებული იქნება - 2006 წლის 30 ნოემბრისთვის ტენდერის გამარჯვებულები ცნობილია, მასალები მომზადებულია - 2007 წლის 31 მაისისთვის რეკლამები ნაჩვენებია 5 მთავარ სატელევიზიო არხზე და 5000 ბუკლეტი და 5000 პლაკატი დარიგებულია 500 ინსტიტუციაში	- კითხვარები დაბრუნებულია - ტენდერის კრიტერიუმები დაწერილი და დამტკიცებულია - ტენდერების გამარჯვებულები ხელს აწერენ კონტრაქტს - რეკლამები ტელევიზიაში გაშვებულია - ბუკლეტები და პლაკატები დარიგებულია	- პარტნიორი მთავრობები თანამშრომლობაზე მოდიან - ადგილობრივი მოსახლეობა, სკოლები და ინსტიტუტები თანამრომლობაზე მოდიან **წინაპირობები** - არსებობენ ადგილობრივი მედია საშუალებები - პროექტისათვის საჭირო ბიუჯეტი დროულად არის გამოყოფილი

8 ღონისძიებების გეგმის შემუშავება

შესასრულებელი სამუშაოს ნაწილებად დაშლა და განაწილება არის მთელი დაგეგმვის პროცესის ლოგიკური საწყისი წერტილი. მას შემდეგ რაც განისაზღვრა პროექტის მიზნის მიღწევისთვის აუცილებელი ღონისძიებები, შემუშავებულ უნდა იქნას პროექტის საბოლოო/სრული გეგმა. თქვენ შეძლებთ შეაფასოთ ღონისძიებების ხანგრძლივობა და მოამზადოთ განრიგი, შეაფასოთ ღონისძიებების ხარჯები და მოამზადოთ პროექტის ბიუჯეტი, გადაანაწილოთ პასუხისმგებლობები, და დაგეგმოთ დაგეგმოთ სხვა საჭირო ნაბიჯები.

არსებობს რამოდენიმე კარგი მიზეზი, რაც განაპირობებს სამუშაოს დანაწილების სტრუქტურის მომზადების მნიშვნელობას:

- სამუშაოს დანაწილების სტრუქტურა წარმოადგენს ჩასატარებელი სამუშაოს ადვილად გასაგებ გრაფიკულ პრეზენტაციას. დაინტერესებული მხარეებისთვის ადვილად მისახვედრია რა ელემენტი აკლია სამუშაოს
- ადამიანები ხშირად სათანადოდ ვერ აფასებენ იმ ძალისხმევას, რაც სჭირდება პროექტის განხორციელებას. კარგად შემუშავებული სამუშაოს დანაწილების სტრუქტურა კარგად გვიჩვენებს რა მოცულობის სამუშაოა ჩასატარებელი
- სამუშაოს დანაწილების სტრუქტურა წარმოადგენს მოსახერხებელ და ლოგიკურ ინსტრუმენტს თითოეული ღონისძიებისთვის საჭირო ხარჯების და დროის განსაზღვრისთვის და გვეხმარება თითოეული ღონისძიებისთვის პასუხისმგებლობების და რესურსების მიწერაში
- სამუშაოს დანაწილების სტრუქტურა წარმოადგენს საუკეთესო საშუალებას პროექტთან დაკავშირებული რისკების განსაზღვრისთვის.

8.1 სამუშაოს დანაწილების სტრუქტურა

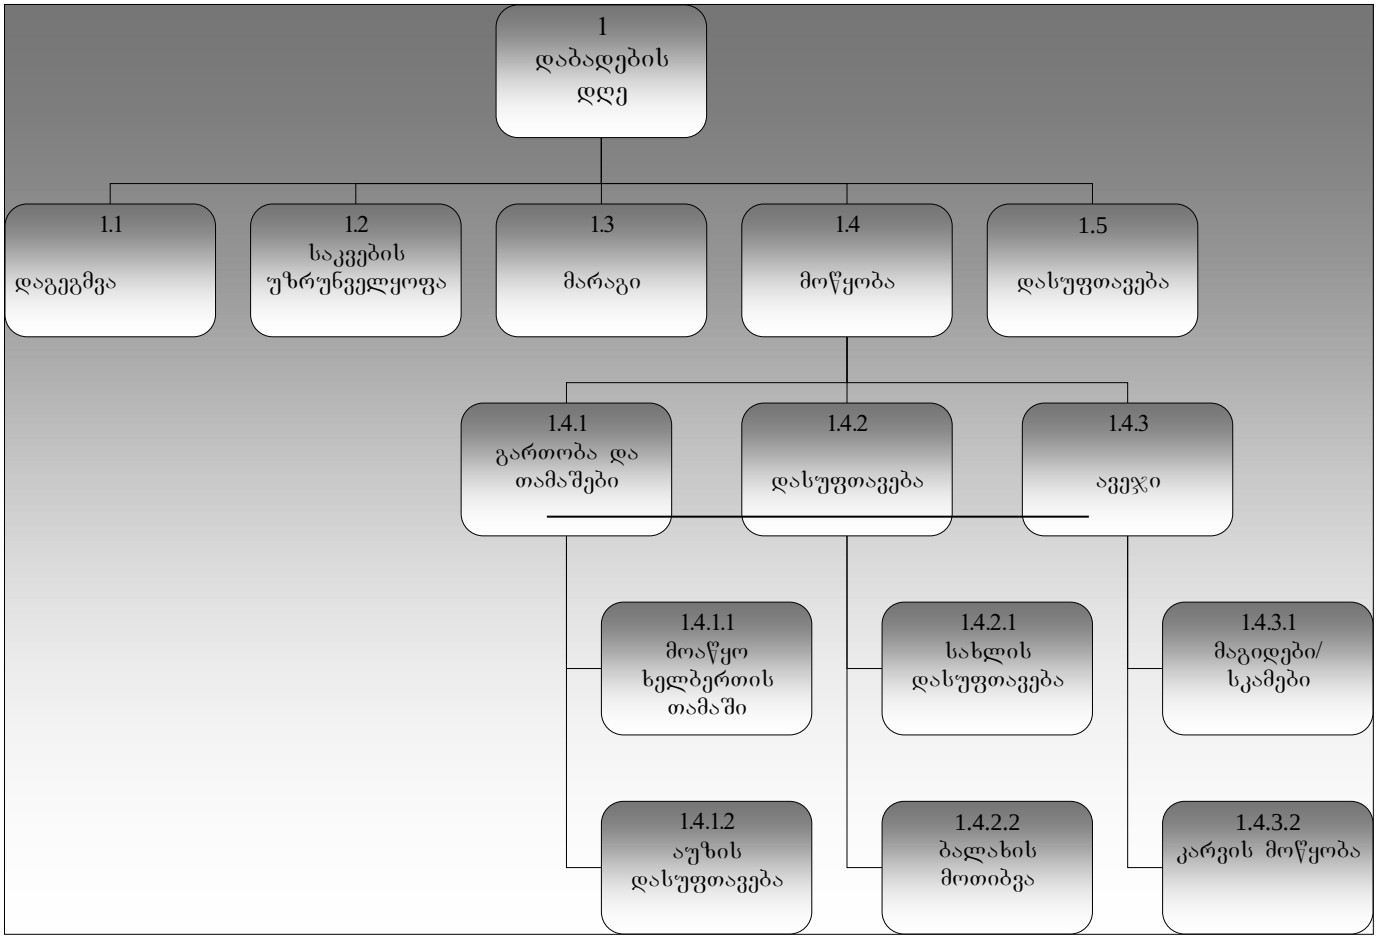

თითოეული ღონისძიებისთვის უნდა განსაზღვროთ შემდეგი განზომილებები:

- დრო (დღეების/კვირების რაოდენობა რომელიც სჭირდება ამ ღონისზიებას)
- ხარჯები (რამდენი დაიხარჯება მასალებსა და შრომაზე)
- საზღვრები (რა სამუშაო ჩატარდება, როგორ და რას მივიღებთ)
- პასუხისმგებლობა (ადამიანი რომელიც პასუხისმგებელი იქნება ამ ღონისძიების წარმატებაზე)
- რესურსები (საჭირო შრომა, მასალები ან მარაგი)
- ხარისხი (რამდენად კარგად უნდა შესრულდეს სამუშაო)

8.2 რესურსები

- ადამიანები
- აღჭურვილობა
- მასალები
- მომსახურება

9 ბიუჯეტი

ბიუჯეტი არის რესურსების სავარაუდო ხარჯების შეფასება რომელიც სჭირდება პროექტის დასრულებას. ბიუჯეტის ფორმატი ძირითადად დამოკიდებულია დონორის მოთხოვნაზე. შეიძლება წარმოდგენილის იყოს შეჯაების ან დეტალური ფორმით. ხარჯები დათვლილია თითოეული ღონისძიებისთვის. ეს მოიცავს მაგრამ ამით არ შემოიფარგლება, სამუშაოს, მასალებს, აღჭურვილობას, სერვისებს, შესაძლებლობებს, საინფორმაციო ტექნოლოგიებს და სპეციალურ კატეგორიებს.

გამოიყენეთ ბიუჯეტის სხვადასხვა ფორმა

ბიუჯეტი უნდა შეესაბამებოდეს ამხსნელ ჩანაწერებს

<u>**მაგალითი**</u>

ბიუჯეტის ხაზი – მგზავრობის ხარჯი - $1500
განმარტება: *ბილეთი (თბილისი-ბერლინი-თბილისი) - $500*
ვიზა - $45
ტაქსი (აეროპორტამდე და აეროპორტიდან) - $10
საცხოვრებელი ადგილი ($50 -1დღე, სულ 12 დღე) - $600
ყოველდღიური ანაზღაურება ($ 10 -1 დღე, სულ 30 დღე) $300
ადგილობრივი ტრანსპორტი - $45

სრული მგზავრობის ხარჯი - $1500

9.1 ფინანსური წყაროები

პროექტის განხორციელება მთლიანად დამოკიდებულია ფინანსურ წყაროებზე. ფინანსურ წყარო შეიძლება იყოს დონორი ორგანიზაცია, სახელმწიფო ბიუჯეტი, ორგანიზაციის

საკუთარი რესურსები ან შემოსავალი, მიღებული პროექტის ღონისძიებებიდან. ხანდახან თავდაპირველად დაფინანსების წყაროებს განსაზღვრავენ პროექტის იდენტიფიკაციამდე

10 პიროვნული დროის მენეჯმენტი

რა არის დროის მენეჯმენტის არსი? დროის მენეჯმენტის ჩვევების შეცვლა მოითხოვს დროს და ძალისხმევას და უფრო ადვილია თუ თქვენ გაქვთ პრაქტიკული წესების მარტივი სისტემა რომ ადვილად დაიმახსოვროთ.

აუცილებელია იმის ცოდნა, თუ რის გაკეთება გვსურს ჩვენს ხელთ არსებული დროის ფარგლებში:

ამის გაკეთების აპრობირებული მეთოდი არის მიზნების **გონივრულად** დასახვა:

- **სპეციფიური**
- **გაზომვადი**
- **მიღწევადი**
- **კონკრეტული**
- **დროზე მიბმული**

ქვემოთ მოცემული დროის მენეჯმენტის სხვა მინიშნებები დაგეხმარებათ თქვენი მიზნების მიღწევაში და დროის მენეჯმენტთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღებაში.

ისწავლეთ განსხვავების დანახვა გადაუდებელსა (სასწრაფო, Urgent) და მნიშვნელოვანს შორის

მნიშვნელოვანი ამოცანები ის ამოცანებია რომელთაც პროექტის მიზნებამდე მიყავხართ და პროგრესი და ჯილდო მოაქვს. უმეტეს შემთხვევაში ასეთი ამოცანები არ არის გადაუდებელი. თავის მხრის, ბევრი გადაუდებელი საქმე ხშირად არ არის მნიშვნელოვანი.

დაგეგმეთ ღონისძიებები თქვენი მიზნების მისაღწევად

გადააქციეთ თქვენი მიზნები სპეციფიური ღონისძიებების სისტემად. დაგეგმვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის თავად დაგეგვის პროცესი. დაგეგმვა დაგვეხმარება პოტენციური კონფლიქტების და კრიზისების განსაზღვრაში და სასწრაფო ამოცანების მინიმიზაციაში. დაგეგმვა ასევე მნიშვნელოვნად შეამცირებს დროს, რომელიც რუტინულ ამოცანებს სჭირდება და დაგიტოვებთ დროს იმისთვის, რისი კეთებაც გსურთ ან რაც მნიშვნელოვნად მიგაჩნიათ მდგრადი პროგრესის მისაღწევად.

გააკეთეთ დროის განრიგი თქვენი ამოცანებისთვის

თქვენი კონცენტრაცია შეიძლება გაფანტოს ბევრმა მოსაწყენმა თუ ნაკლებად მნიშვნელოვანმა საკითხმა. დაუსრულებელი ამოცანები, რომლებზედ მუდმივად ფიქრობთ, დიდი ენერგიეს ხარჯვას იწვევს. ხშირად, მათი თავიდან ამოგდება რთულია. ერთადერთი გზა ამ შემთხვევში არის ასეთი დაუსრულებელი საქმეების დაუყოვნებლივ დასრულება ან დროში გაწერა.

იცოდეთ რაში ხარჯავთ დროს

გააანალიზეთ ერთ კვირაში დახარჯული დროს. გაიაზრეთ რამდენი დრო დახარჯეთ სასწრაფო ან მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე ან რომელ თანამშრომელს დაუთმეთ დროის ყველაზე მეტი ნაწილი.

11 კრიტიკული გზა და პერტი (PERT)

პროექტის მენეჯმენტში კრიტიკული გზის მეთოდი არის პროექტის შემადგენელი ღონისძიებების ჯაჭვი, რომელსაც მივყავართ პროექტის დასასრულამდე. კრიტიკული გზის ხანგრძლივობა განსაზღვრავს მთლიანი პროექტის ხანგრძლივობას. კრიტიკული გზის საბოლოო ელემენტის ნებისმიერი შეფერხება მოქმედებს პროექტის დასრულების თარიღზე. პროექტს შეიძლება ჰქონდეს რამდენიმე პარალელური კრიტიკული გზა. დამატებითი პარალელური გზა, რომელსაც თავისი ხანგრძლივობები აქვს და კრიტიკული გზაზე მოკლეა მოკლეა სუბ-კრიტიკული გზა ეწოდება.

11.1 კრიტიკული გზის მეთოდი

კრიტიკული გზის მეთოდი შეიქმნა დუპონის კორპორაციის მიერ 1950-იან წლებში. განტის ცხრილებთან ერთად კრიტიკული გზის მეთოდი გვეხმარება ყველა იმ ამოცანის დაგეგმვაში, რომელიც უნდა შესრულდეს პროექტის განმავლობაში. ისინი წარმოადგენენ საფუძველს როგორც განრიგის მომზადების, ასევე და რესურსების დაგეგმვის პროცესში. პროექტის მენეჯმენტის დროს ისინი გვაძლევენ პროექტის მიზნების მიღწევების მონიტორინგის საშუალებას. ისინი გვეხმარებიან დავინახოთ თუ სად არის „განკურნების“ ღონისძიება საჭირო და რომ პროექტი უკან დავაბრუნოთ.

კრიტიკული გზის მეთოდის გამოყენების უპირატესობა განტის ცხრილებთან შედარებით არის ის, რომ კრიტიკული გზის ანალიზი განსაზღვრავს იმ ამოცანებს, რომლებიც უნდა შესრულდეს დროულად და მოხდეს პროექტის დასრულებისთვის ხელის შეწყობა და ასევე გვიჩვენებს რომელი ამოცანების შესრულება შეიძლება გადაიდოს დროებითი იმისათვის, რომ გამონთავისუფლებული რესურსები მიემართოს გამოტოვებული ან ისეთი ამოცანებისკენ, რომელთა შესრულება შეჩერებულია. კრიტიკული გზის მეთოდის ნაკლი არის ის, რომ ამოცანების დროსთან მიმართება არ ჩანს ისე მკაფიოდ, როგორც განტის ცხრილებში.

კრიტიკული გზის მეთოდის სხვა უპირეტესობა არის ის, რომ იგი გვეხმარება იმ მინიმალური დროის განსაზღვრაში, რომელიც სჭირდება პროექტს და გვიჩვენებს პროექტის რა ეტაპზე უნდა ავაჩქაროთ ტემპი, იმისათვის, რომ დროულად დასრულდეს პროექტი. ეს კი ხელს უწყობს ხარჯების მინიმიზაციას და საბოლოო მიზნების მიღწევას.

<u>მაგალითი</u>

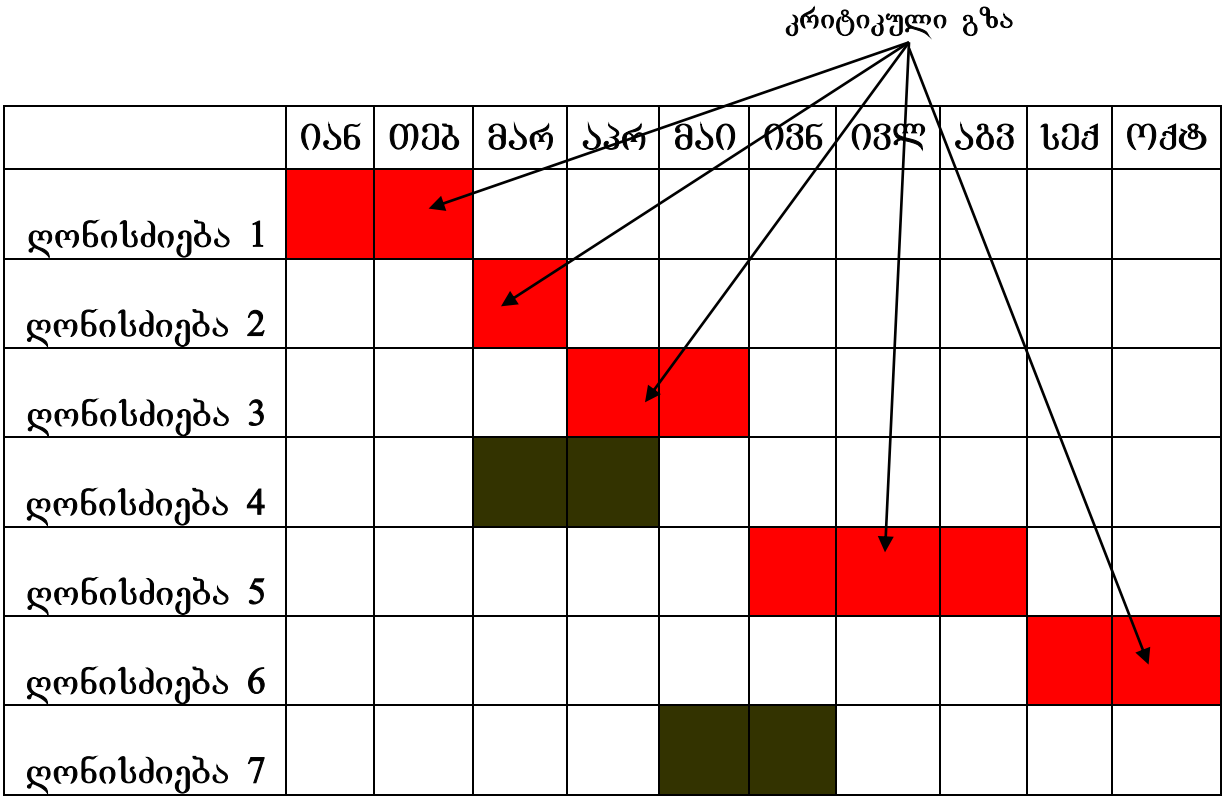

11.2 პერტი

პროგრამის შეფასების და განხილვის ტექნიკა რომლის აბრევიატურა არის პერტი (PERT - Programme Evaluation and Review Technique) არის პროექტის მენეჯმენტის ტექნიკა, რომელიც გამოიგონეს შეერთებული შტატების თავდაცვის დეპარტამეტის საზღვაო პროექტების ოფისმა 1958 წელს.

პერტი (PERT) არის პროექტის შესრულებისას განსახორცილებელი ამოცანების ანალიზის მეთოდი, რომელიც განსაზღვრავს თითოეული ამოცანისთვის და მთლიანად პროექტის განხორციელებისთვის საჭირო ვადებს.

მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ყველა კოპანიას თავისი საკუთარი "პროექტის მოდელი" აქვს შემუშავებული, ისინი რადაც ასპექტში მაინც პერტ-ის მსგავსია. მხოლოდ დუპონის კორპორაციის მიერ შექმნილი კრიტიკული გზის მეთოდის გამოგონება მოხდა დაახლოებით იმავე დროს როდესაც შეიქმნა პერტი.

პერტის არსი კრიტიკული გზის მეთოდის ვარიაცია, რომელსაც უფრო სკეპტიკური დამოკიდებულება აქვს პროექტის თითოეულ ეტაპის საჭირო დროის შეფასების პროცესზე. მის გამოსაყენებლად უნდა შეფასდეს უმოკლესი დრო, რომელიც თითოეულ ღონისძიებაზე იხარჯება, დაახლოებითი დრო რაც შეიძლება დაიხაჯოს, და მაქსიმალური დრო, რომელიც შეიძლება დასჭირდეს ღონისძიებას..

პროექტის თითოეული ეტაპისათვის საჭირო დროის გამოსათვლელი ფორმულა (პერტის ფორმულა):

$$\frac{\text{უმოკლესი დრო} + 4\text{X}\text{მიახლოებული დრო} + \text{უგრძელესი დრო}}{6}$$

ფურმულა გვეხმარება დროის შეფასების არარეალისტური ტენდენციებისგან განთავისუფლებაში.

მთავარი აქცენტები:
კრიტიკული გზის ანალიზი არის ეფექტური და ძლიერი მეთოდი რომ შევაფასოთ:

- რა დავალებები უნდა შესრულდეს
- სად შეიძლება პარალელური ღონისძიებების განხორციელება
- პროექტის დასრულების უმოკლესი დრო
- პროექტის დასრულებისთვის საჭირო რესურსები
- ღონისძიებების თანმიმდევრობის და დროის განრიგი
- ამოცანების პრიორიტეტულობა
- ყველა ეფექტური გზა სასწრაფო პროექტებზე დროის შემცირების

ეფექტურ კრიტიკული გზის ანალიზს შეუძლია კომპლექსურ პროექტებში წარმატების და წარუმატებლობის განსხვავების გაკეთება. ის არის ძალიან გამოსადეგი იმ პრობლემების მნიშვნელობის შეფასებისას რომლებიც პროექტის განხორციელების დროს ვაწყდებით.

12 გუნდის ფორმირება

> **“გუნდი ეს არის ადამიანების ჯგუფი, რომელიც აკეთებს იმას, რასაც მე ვამბობ”.**
>
> ***ანონიმური უფროსი***

არსებობს რამდენიმე მოდელი პროექტის განმავლობაში პროექტის გუნდის საქმიანობის შესაფასებლად. ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მოდელი გვთავაზობს ოთხ საფეხურს:

ფორმირება: ამ საფეხურზე ადამიანები აგროვებენ პროექტის შესახებ ინფორმაციას. ისინი ფიქრობენ იმაზე, თუ რისი გაკეთება მოუწევთ, ვინ არის გუნდში, როგორ შეეწყობიან სხვა წევრებს, როგორ იმოქმედებს თქვენი ლიდერული თვისებები მათზე და სხვა მრავალ საკითხზე რომლებიც დაკავშირებულია პროექტის დაწყებასთან.

შტორმი: ამ ეტაპზე გუნდის წევრები რეაგირებენ იმაზე რაც ისწავლეს ფორმირების საფეხურზე. ისინი გამოთქვამენ აზრებს პროექტის მიზნების, მათი ფუნქციების, პასუხისმგებლობები და მოთხოვნების შესახებ. გუნდის წევრები ასევე წყვეტენ, თუ რამდენად მოწონხართ თქვენ და თქვენი ლიდერული სტილი.

რეგულირება: თუ ნებისმიერი კონფლიქტი, რომელიც წარმოიშობა შტორმის ეტაპზე, სწორად გადაიჭრა, გუნდი გადავა რეგულირების საფეხურზე. ამ საფეხურზე გუნდის წევრები

უკეთ ეცნობიან პროექტს და საკუთარ როლს ამ პროექტში. ისინი იწყებენ იმ საქმეზე ფოკუსირებას, რაც უნდა გაკეთდეს. ქცევითი ნორმები ვითარდება და გუნდის წევრებმა იციან რას უნდა ელოდნენ სხვებისგან.

შედეგიანი მუშაობა: ამ ეტაპზე სამუშაო თითქმის რუტინად იქცევა. გუნდის წევრები კარგად მუშაობენ ერთად და აღწევენ მაღალი ხარისხის შედეგებს. ყველა წევრს ესმის სხვების მოვალეობები და ქცევითი თავისებურებები. ისინი წყვეტენ პრობლემებს, იღებენ გადაწყვეტილებებს და ერთმანეთთან წყნარი ურთიერთობა აქვთ.

როგორც კი გუნდი განვითარდება და მომწიფდება, მისი წევრები უფრო დამოუკიდებლები ხდებიან, რაც თქვენს ნაკლებ პირდაპირ ჩართულობას მოითხოვს. თქვენ უნდა მოარგოთ თქვენი ლიდერული სტილი პროექტის მთელ მიმდინარეობას მისი ზრდის სიჩქარის მიხედვით.

> სამუშაო ძალის მოტივირება მუდმივ სირთულეს წარმოადგენს პროექტის მენეჯერისთვის.

როგორ გავხადოთ გუნდი მოტივირებული?

- შექება და აღიარება
- მზაობა (Openness)
- ინფორმაციის მიწოდება
- უფლებების დელეგირება
- მენეჯმენტისგან პოზიტიური მაგალითების დამკვიდრება
- ხარისხობრივი მაჩვენებლების გარდა, პირადი შეხედულებების გათვალისწინება
- ერთობლივი ღონისძიებები ორგანიზაციის გარეთ
- ტრენინგებზე დასწრების შეთავაზება
- ზუსტად დაგეგმილი და რეგულარული შეხვედრები
- თქვენი კოლეგების სურვილებისა და საჭიროებების ცოდნა და გათვალისწინება
- პირადი პრობლემების მოგვარების მცდელობა

13 ტექნიკური დავალება (Terms of Reference)

პროექტის მენეჯერი აძლევს უფლებამოსილებას ადამიანს ან ადამიანთა ჯგუფს მათი კომპეტენციის ფარგლებში შეასრულოს პროექტით გათვალისწინებული დავალებები. ასეთი უფლებამოსილების მინიჭების გარეშე ადამიანების მუშაობა არ იქნებოდა იურიდიულად გამართლებული და დაცული. ტექნიკური დავალება (Terms of Reference) ცხადყოფს რას მოითხოვს პროექტის მენეჯერი და როგორ და როდის უნდა შესრულდეს ეს მოთხოვნა.
ქვემოთ მოყვანილია ტექნიკური დავალების რამოდენიმე სახე.

<u>**მაგალითი :**</u>
ტექნიკური დავალება

ორგანიზაციის სახელი
საქმე ეხება ენერგიის გამანაწილებელი კომპანიისა და განახლებადი ენერგიის პროექტის განხორციელებადობის შესწავლას ფილიპინებზე.

წევრი კომპანია	
სტატუსი	
მისამართი	
ტელეფონი	
ფაქსი	
ელ-ფოსტა	
ინტერნეტი	

ექსპერტი 1	
ტელეფონი	
ფაქსი	
ელ-ფოსტა	
ექსპერტის მოვალეობები	• • •
სამუშაო დღეების რაოდენობა	1. 2. 3.

გადასახდელი	სამუშაო დღეების რაოდენობა	
	სამუშაოს ყოველდღიური ანაზღაურება	
	მთლიანი თანხა	
	საკუთარი წვლილი	
	ზუსტი თანხა	
დღიური ხარჯები	დღიური ხარჯები ნაზღაურდება მხოლოდ უცხოეთის ქვეყნებში სამუშაო მივლინების დრის	
	დღიური ნიხრი	ევროკავშირის დღიური ოფიციალური ნიხრიდან ევროკავშირის მაქსიმალურ დღიურ ნიხრამდე
	საკუთარი წვლილი	

მგზავრობის	ანაზღაურებას ექვემდებარება მხოლოდ 200 კმ-ზე შორი

ანაზღაურება	მგზავრობა	
	საერთაშორისო ფრენა	ეკონომ-კლასი – 100% (ბილეთის დაჯავშნის, აეროპორტის მოსაკრებლების, ვიზისა და დაზღვევის ღირებულებების ჩათვლით)
	მაქსიმუმ 5 საერთაშორისო ფრენა	გადაწყდება პროექტის განვითარების შესაბამისად

გადახდა	ჩეკების და ინვოისების, ასევე საკუთარი დანახარჯების და სხვა დამამტკიცებელი დოკუმენტების საფუძველზე.	
	ჰონორარი	თაიმ-შიტი და მისიის/ღონისძიებების ანგარიშები
	დღიური ანაზღაურება	თაიმ-შიტი და მგზავრობის დოკუმენტები
	მგზავრობა	ბილეთები, ჩასხდომის ბარათები, ინვოისები და ჩეკები

ფინანსური იდენტიფიკაცია	გადახდა იწარმოებს ევროში მხოლოდ შემდეგ საბანკო ანგარიშზე; სხვა ვალუტა უნდა გადაიცვალოს ევროკავშირის ყოველთვიური განახლებულ კურსის მიხედვით	
	ბანკის სახელი	
	ბანკის მისამართი	
	ანგარიშის მფლობელი	
	ანგარიშის ნომერი	
	IBAN	
	BIC/SWIFT	
საბოლოო პირობები		

თარიღი, ხელმოწერა---------- თარიღი, ხელმოწერა----------

14 შესყიდვების მენეჯმენტი

პროექტის შესყიდვების მენჯმენტი არის იმ პროდუქციის ან მომსახურების შეძენის ან ათვისების პროცესი, რომელიც სჭირდება პროექტის გუნდს სამუშაოს შესრულებისთვის. შესყიდვების ორი სახე არსებობს. ორგანიზაცია შეიძლება იყოს პროდუქციის ან მომსახურების მყიდველი ან გამყიდველი.

პროექტის შესყიდვების მენეჯმენტში შედის კონტრაქტის მენეჯმენტი და კონტროლის პროცესების ცვლილებები, რომელიც საჭიროა კონტრაქტების ადმინისტრირებისთვის და იმ მითითებების შესრულება, რომლებსაც პროექტის გუნდის უფლებამოსილი წევრები იძლევიან. პროექტის შესყიდვების მენჯმენტის პროცესი შემდეგნაირია:

- დაგეგმეთ შესყიდვები – განსაზღვრეთ რა უნდა შეიძინოთ ან აითვისოთ და როდის და როგორ
- დაგეგმეთ კონტრაქტის გაფორმების პროცესი – პროდუქტების და მომსახურების მოთხოვნის დოკუმენტირება და პოტენციური გამყიდველების იდენტიფიცირება
- მოითხოვეთ მომწოდებელი კომპანიების წინადადებები – მოიპოვეთ ინფორმაცია, შემოთავაზებები, ფასები როგორც საჭირო იქნება
- შეარჩიეთ მომწოდებელი კომპანიები – შემოთავაზებების გადახედვა, პოტენციურ გამყიდველებს შორის არჩევა და თითოეულ გამყიდველთან წერილობითი კონტრაქტის შეთანხმება
- გაფორმებული კონტრაქტების ადმინისტრირება – კონტრაქტის და მყიდველს და გამყიდველს შორის ურთიერთობის მენეჯმენტი, იმის განხილვა და დოკუმენტირება, თუ გამყიდველი როგორ ასრულებს ან შეასრულა აუცილებელი ღონისძიებები და როგორი საფუძველი მოამზადა მომავალში მყიდველთან ურთიერთობისთვის, კონტრაქტთან დაკავშირებული ცვლილებების მენეჯმენტი და როცა საჭიროა, პროექტის გარე მყიდველთან კონტრაქტთან დაკავშირებული ურთიერთობების მენეჯმნეტი.
- კონტრაქტების დასრულება – თითიეული კონტრაქტის დასრულება, რომელიც მოიცავს ნებისმიერი ღია საკითხის გადაჭრას, და თითუეული კონტრაქტის დახურვა პროექტის ან პროექტის ფაზეს შესაბამისად.

თითოეული პროცესი შეიძლება მოიცავდეს ერთი ან მეტი ადამიანის ან ჯგუფების პროექტის მოთხოვნებზე დაფუძნებულ ძალისხმევას. თითიეულ პროცესს ადგილი აქვს სულ მცირე ერთხელ ნებისმიერ პროექტში და ადგილი აქვს პროექტის ერთ ან მეტ ფაზაში თუ, რა თქმა უნდა, პროექტი დაყოფილია ფაზებად. პროექტის შესყიდვების მენჯმენტის პროცესი მოიცავს კონტრაქტებს რომლებიც წარმოადგენენ ლეგალურ დოკუმენტებს მყიდველს და გამყიდველს შორის. ზოგიერთი ორგანიზაცია ინახავს დოკუმენტების სიას ინფორმაციით სამომავლო და მნიშვნელოვნად კვალიფიცირებული გამყიდველების შესახებ. ხშირად ასსეტ გამყიდველებს უწოდებენ "ფასის შემთავაზებლებს" (ბიდდერ), ეს სია ჩვეულებრივ მოიცავს ინფორმაციას სამომავლო გამყიდველების შესახებ რელევანტურ წარსულ გამოცდილებას და მახასიათებლებს. ზოგიერთი ორგანიზაციას აქვს მათთვის პრიორიტეტული გამყიდველების სია, რომლებიც უკვე რაგაც მეთოდით შეირჩნენ. კვალიფიცირებული გამყიდველების სია შეიძლება შეირჩეს ორგანიზაციის ასსეტს-ის მიხედვით თუ ასეთი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია. არის თუ არა ინფორმაცია ხელმისაწვდომი პროექტის გუნდმა უნდა სექმნას საკუთარი წყაროები. ზოგადი ინფორმაცია ფართოდ ხელმისაწვდომია ინტერნეტის, ბიბლიოთეკის დირექტორიების, სავაჭრო კატალოგების, რელევანტური ადგილობრივი ასოციაციების და მსგავსი წყაროების საშუალებით. სფეციფიურ წყაროებზე დეტალური ინფორმცია შეიძლება მოითხოვდეს ფართო/ექსტენსიურ ძალისხმევას, როგორიცაა საიტ ვიზიტები და ძველ კლიენტებთან კონტრაქტები. შესყიდვების დოკუმენტები ასევე შეიძლება

გაიგზავნოს რომ განვსაზღვროთ სამომავლო გამყიდველებს შორის თუ ვინმეს აქვს სურვილი გახდეს კვალიფიცირებული პოტენციური გამყიდველი.

15 ხარისხის მენეჯმენტი

პროექტის ხარისხის მენეჯმენტის პროცესები მოიცავს შემსრულებელი ორგანიზაციის ყველა იმ ღონისძიებას, რომელიც განსაზღვრავს ხარისხის პოლიტიკას, მიზნებს და პასუხისმგებლობებს ისე, რომ პროექტის დააკმაყოფილებს იმ საჭიროებებს, რომლისთვისაც ის შეიქმნა. ხარისხი მენეჯმენტი ხორციელდება ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის, პროცედურების, ხარისხის გარანტიისა და კონტროლის პირობებში, ისე, რო შენარჩუნებულია ღონისძიებების გაუმჯობესების მუდმივი პროცესი. პროექტის ხარისხის მენეჯმენტის პროცესები მოიცავს:

- ხარისხის დაგეგმვას – განსაზღვრავს ხარისხის იმ სტანდარტებს, რომელიც შეესაბამება პროექტს და მათი მიღწევის გზებს.
- ხარისხის უზრუნველყოფას – ეხება დაგეგმილ, სისტემატურ ხარისხის ღონისძიებებს პროექტის ყველა თანამშრომლის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მყოფი მუშაობის უზრუნველსაყოფად.
- ხარისხის კონტროლს – ეხება პროექტის სპეციფიური შედეგების მონიტორინგს და ადგენს აკმაყოფილებენ თუ არა შედეგები შესაბამის ხარისხობრივ სტანდარტებს და რა გზები არსებობს არადამაკმაყოფილებელი მუშაობის გამოსასწორებლად.

ხარისხის მენეჯმენტის სირთულე არის დაინტერესებული მხარეების საჭიროებების, სურვილების და მოლოდინების გადაქცევა მოთხოვნებად. გაცხადებული და ნაგულისხმევი საჭიროებები წარმოდგენენ წვლილს პროექტის მოთხოვნების განვითარებაში.

თანამედროვე ხარისხის მენეჯმენტი ავსებს პროექტის მენეჯმენტს. მაგ: ორივე აღიარებს შემდეგის მნიშვნელობას:

- **დაინტერესებული მხარეების დაკმაყოფილება.** საჭიროა გავიგოთ, შევაფასოთ, განვსაზღვროთ და ვმართოთ მოლოდინები, რათა დავრწმუნდეთ, რომ დაინტერესებული მხარეების მოთხოვნები დაკმაყოფილებულია. ეს მოითხოვს შესაბამისობის მოთხოვნებთან კომბინაციას (პროექტმა უნდა შექმნან ის პროდუქტი, რომელიც უნდა შექმნილიყო) და გამოყენების ადექვატურობას (პროდუქტი ან მომსახურება აკმაყოფილებს რეალურ საჭიროებებს)
- **პრევენცია ინსპექტირების ნაცვლად.** როგორც გამოკვლევებით არის დადგებილი, შეცდომის პრევენციის ხარჯები, როგორც წესი, უფრო მცირეა, ვიდრე შემდგომ ამ შეცდომის გამოსწორების.
- **მმართველი რგოლის პასუხისმგებლიანობა.** წარმატება მოითხოვს პროექტს გუნდის ყველა წევრის მონაწილეობას, მაგრამ, ცხადია, მმართველი რგოლზეა დამოკიდებული იმ რესურსების უზრუნველყოფა, რომელიც წარმატებისთვისა არის საჭირო.
- **მუდმივი ზრუნვა გაუმჯობესებაზე.** დაგეგმე-გააკეთე-შეამოწმე-იმოქმედე ციკლი არის ხარისხის გაუმჯობესების საფუძველი. ხარისხის გაუმჯობესების დამატებით ინიციატივებს, როგორიცაა თ (თოტალ უალიტყ ანაგემენტ) ანდ შიხ შიგმა, შეუძლიათ გააუმჯობესონ, როგორც პროექტის მენეჯმენტის, ასევე პროექტის პროდუქციის ხარისხი.

15.1 ხარისხის მენეჯმენტის ხერხები

დანახარჯებისა და შედეგების ანალიზი
ხარისხის დაგეგმვაში უნდა გავითვალისწინოთ დანახარჯებისა და შედეგების თანაფარდობა. ხარისხის მოთხოვნის შესრულების დადებითი მხარე არის ნაკლები ხელახლა გამეორებული სამუშაო, რაც, რაც თავის მხრივ, ნიშნავს უფრო მაღალ პროდუქტულობას, ნაკლებ დანახარჯებს და დაინტერესებული მხარეების მოთხოვნების დაკმაყოფილებას.

15.1.1 ბენჩმარკინგი

ბენჩმარკინგი მოიცავს აქტუალური და დაგეგმილი პროექტების გამოცდილების შედარებას სხვა პროექტებთან, რომლის მიზანია გაუმჯობესებისაკენ მიმართული იდეების გენერირება. ბენჩმარკინგი უზრუნველყოფს იმ ბაზისს, რომელზეც იზომება შესრულების ხარისხი.

15.2 ხარისხის უზრუნველყოფის ხერხები

15.2.1 ხარისხის დაგეგმვის ხერხები

ხარისხის დაგეგმვის ხერხები შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ხარისხის უზრუნველყოფის ღონისძიებებისთვის.

15.2.2 ხარისხის რეგულარული აუდიტი

ხარისხის რეგულარული აუდიტი არის სტრუქტურირებული, დამოუკიდებელი განხილვა იმისა, თუ რამდენად შეესაბამება პროექტის ღონისძიებები საერთო ორგანიზაციულ პოლიტიკას, პროცესებს და პროცედურებს. ხარისხის რეგულარული აუდიტის მიზანია არაეფექტური პოლიტიკის, პროცესების და პროცედურების განსაზღვრა.

15.3 პროცესების ანალიზი

პროცესების ანალიზი მოიცავს ორგანიზაციული და ტექნიკური პოზიციიდან გამომდინარე გაუმჯობესებების განსაზღვრას. ეს ანალიზი ასევე გამოავლენს იმ პრობლემებს და სიძნელეებს, რომლებიც პროცესის მიმდინარეობის დროს ხდება. პროცესის ანალიზი მოიცავს ძირფესვიანი ანალიზის პროცესს (Root Cause Analyses), სპეციფიურ ტექნიკას პრობლემის/სიტუაციის ანალიზისთვის, რომელიც განსაზღვრავს იმ ძირეულ მიზეზებს, რომლებსაც მივყავართ მთავარ გამომწვევ პრობლემამდე და განსაზღვრავს პრევენციული ღონისძიებებს ყველა მსგავსი პრობლემისთვის.

15.4 ხარისხის კონტროლის ხერხები

15.4.1 მიზეზ-შედეგობრივი დიაგრამა

მიზეზ-შედეგობრივი დიაგრამა, რომელიც ასევე ცნობილია იშიკავას ან ფიშბორნის დიაგრამების სახელით, გვიჩვენებს თუ როგორ შეიძლება იყოს სხვადასხვა ორგანიზაციული ფაქტორი დაკავშირებული პოტენციურ პრობლემებთან ან შედეგებთან.

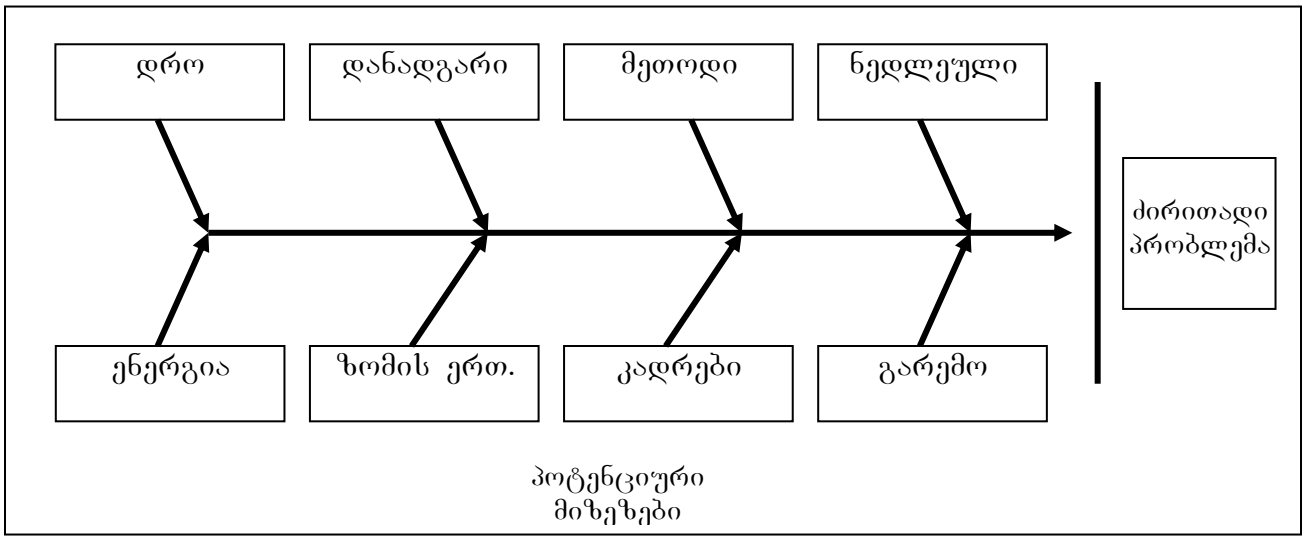

15.4.2 ინსპექტირება

ინსპექტირება არის სამუშაოს შედეგად მიღებული პროდუქტის გამოცდა მისი სტანდარტებთან შესაბამისობის გამოსავლენად. ინსპექტირება ხშირად მოიცავს გაზომვებს. ინსპექტირება პროექტის მიმდინარეობის ნებისმიერ საფეხურზე შეიძლება განხორციელდეს. მაგალითად, შეიძლება ერთი რომელიმე ღონისძიების შედეგი ან პროექტის საბოლოო შედეგი იყოს ინსპექტირებული. ინსპექტირებას ასევე უწოდებენ, განხილვასა და აუდიტებს.

15.4.3 სტატისტიკური შერჩევა

სტატისტიკური შერჩევა მოიცავს ინსპექტირებისათვის საჭირო პოპულაციის შერჩევას. სწორი და ზუსტი შერჩევა ამცირებს ხარისხის კონტროლის ხარჯებს. არსებობს საკმარისი ინფორმაცია სტატისტიკურ შერჩევაზე; ზოგიერთ სფეროში აუცილებელია პროექტის გუნდის წევრები იცნობდნენ შერჩევის ზოგიერთ ტექნიკას.

16 პროექტის ხარჯების მენეჯმენტი

პროექტის ხარჯების მენეჯმენტი მოიცავს დაგეგმვის, ღირებულებების, გაანგარიშების, ბიუჯეტის შედგენის და დანახარჯების კონტროლის პროცესების შემადგენელ ნაწილებს და მიზნად ისახავს პროექტის განხორციელებას დამტკიცებული ბიუჯეტის ფარგლებში.

ხარჯების გაანგარიშება – იმ რესურსებისთვის საჭირო მიახლოებითი ხარჯების თანხის რაოდენობის განსაზღვრა, რომელიც საჭიროა პროექტის ღონისძიებების შესასრულებლად.

ხარჯების ბიუჯეტირება – ინდივიდუალური ღონისძიებების ან სამუშაო პაკეტების ხარჯების დაჯგუფება პროექტის ბიუჯეტი შესადგენად.

ხარჯების კონტროლი – იმ ფაქტორებზე ზემოქმედება, რომლებიც ქმნიან ხარჯების განსხვავებულობას/შეუთანხმებლობას და პროექტის ბიუჯეტის ცვლილებების კონტროლი.

ეს პროცესები ერთმანეთთან დაკავშირებულია. თითოეული მათგანი შეიძლება მოიცავდეს ერთი ან მეტი ადამიანის ან ჯგუფის ძალისხმევას პროექტის საჭიროებებზე დაყრდნობით.

პროექტის მენეჯმენტის პროცესში მნიშვნელოვანია იმ რესურსების ხარჯები, რომელიც დაგეგმილი ღონისძიებებისთვის არის საჭირო. თუმცა, ხარჯების მენეჯმენტისას გათვალისწინებული უნდა იყოს პროექტის გადაწყვეტილებების ზემოქმედება ხარჯების გამოყენებაზე პროექტის შედეგად შესაქმნელი პროდუქტსს, შედეგის ან მომსახურებას. მხარდაჭერის პირობებში. მაგალითად, დაგეგმვასთან დაკავშირებული განხილვების რაოდენობების ლიმიტირება შეამცირებს პროექტის ხარჯებს სამოქმედო ხარჯების გაზრდის ხარჯზე. პროექტის ხარჯების მენეჯმენტის ამ ფართო ხედვას ხშირად უწოდებენ პროექტის ციკლის ხარჯებს. ციკლის ხარჯებს შეუძლია გააუმჯობესოს პროექტის შედეგის ხარისხი.

17 ცვლილებების მენეჯმენტი

ცვლილებების მენეჯმენტი არის პროექტის დაწყებიდან მის დასრულებამდე მიმდინარე პროცესების ერთობლიობა. ცვლილებების მენეჯმენტი არის აუცილებელი მოვლენა, რადგან პროექტები იშვიათად მიყვებიან გეგმას. ცვლილებების მენეჯმენტის ღონისძიებები მოიცავს:

- ცვლილების მოხდენის აუცილებლობის ან უკვე მოხდენილი ცვლილების იდენტიფიცირებას
- საჭირო ცვლილებების განხილვას და დამტკიცებას
- დამტკიცებული ცვლილებების მენეჯმენტს და მოსალოდნელი (მოთხოვნილი) ცვლილებების რეგულირებას
- პრევენციული და ცვლილების შეტანის ყველა ღონისძიების განხილვას და დამტკიცებას
- პროექტის შინაარსის, ხარჯვითი ნაწილის, ბიუჯეტის, განრიგისა და ხარისხობრივი მოთხოვნების მუდმივი კონტროლს და გადახალისებას
- მოსალოდნელი ცვლილებების პროექტზე გავლენის დოკუმენტირებას

მოსალოდნელი ცვლილებები მოითხოვს ახალ ან ხელახლა გადახედილ ხარჯების განაწილებას, ღონისძიებების თანმიმდევრობის განრიგს, თარიღების განრიგს, რესურსების მოთხოვნებს და რისკზე პასუხის ალტერნატივების ანალიზს. ცვლილებები შეიძლება მოითხოვდეს პროექტის მენეჯმენტის გეგმის კორექციას/რეგულირებას.

17.1 ცვლილებების მენეჯმენტი ხერხები

17.1.1 პროექტის მენეჯმენტის საინფორმაციო სისტემები

პროექტის მენეჯმენტის საინფორმაციო სისტემები ავტომატური სისტემებია და გამოიყენება პროექტის მენეჯმენტის გუნდის მიერ, როგორც დამხმარე ხერხი ცვლილებების კონტროლის პროცესების განხორციელებისთვის, რომელიც აადვილებს უკუკავშირის მიღებას ცვლილებების განხორციელების კონტროლს.

17.1.2 ექპერტთა შეფასებები

პროექტის მენეჯმენტის გუნდი იყენებს ექსპერტთა მოსაზრებებს, პროექტის ნებისმიერი ასპექტის მოსალოდნელი ცვლილებების გასაკონტროლებლად ან დასამტკიცებლად.

17.1.3 საჭირო საბუთები

ცვლილებების შედარება

- თავდაპირველ მიზნებთან
- ღონისძიებების თანმიმდევრობასთან
- ბიუჯეტთან
- რესურსებთან

- საჭირო დროსა და ვადებთან

17. 2 ცვლილებების გატარების მენეჯმენტი

- განიხილეთ ცვლილება
- შეიტანეთ ცვლილება პროექტის გეგმაში
- მიაწოდეთ ინფორმაცია ყველა დაინტერესებულ მხარეს

18 მონიტორინგი და კონტროლი

მონიტორინგი და კონტროლი ხორციელდება პროექტის ინიცირების, დაგეგმვის, განხორციელების და დასრულების ფაზების ზედამხედველობის მიზნით. მაკორექტირებელი და პრევენციული ღონისძიებები ხორციელდება პროექტის მიღწევების გასაკონტროლებლად. მონიტორინგი არის პროექტის მენეჯმენტის ნაწილი, რომელიც მთელი პროექტის მიმდინარეობის განმავლობაში ხორციელდება. მონიტორინგი მოიცავს: ინფორმაციის შეგროვებას, გაზომვას, მიღწევების შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას, შეფასებას და იმ ტენდენციებს, რომლებიც გავლენას ახდენენ პროცესის გაუმჯობესებაზე. მუდმივი მონიტორინგი პროექტის მენეჯმენტის გუნდს პროექტის სიჯანსაღეში წვლილის შეტანის საშუალებას აძლევს და განსაზღვრავს ნებისმიერ სფეროს, რომელსაც უფრო მეტი ყურადღება სჭირდება. პროექტის მენეჯმენტი ინსტიტუტის მიხედვით, მონიტორინგის და კონტროლის პროცესები თავის თავში მოიცავენ:

- პროექტის ამჟამინდელი შესრულების პროექტის გეგმასთან შედარებას
- შესრულების შეფასებას, იმისათვის, რომ განისაზღვროს რა კორექციული თუ პრევენციული ღონისძიებებია საჭირო და როდის არის ამ ღონისძიებების გატარება აუცილებელი
- პროექტის რისკების ანალიზი, ჩაწერა და მონიტორინგი რისკების არსებობაში, მათზე ანგარიშის მომზადებაში და შესაბამისი საპასუხო გეგმის განხორციელებაში დასარწმუნებლად
- საბოლოო პროდუქტის შესახებ ზუსტი და დროული საინფორმაციო ბაზისა და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოება
- იმ სტატუსის რეპორტის, პროგრესის დონისა და პროგნოზირებისათვის საჭირო ინფორმაციის უზრუნველყოფა
- პროგნოზების უზრუნველყოფა ხარჯებისა და მიმდინარე განრიგის შესახებ ინფორმაციის განახლებისთვის
- დამტკიცებულ ცვლილებებზე მონიტორინგის განხორციელება

მონიტორინგსა და ცონტროლს შორის განსხვავება ისაა რომ პროექტის მენეჯმენტი ახორციელებს მონიტორინგს **პროგრესის დასაფიქსირებლად,** მაშინ როცა კონტროლი ხორციელდება **მაკორექტირებელი ღონისძიებების გასატარებლად.**

მონიტორინგი და კონტროლი ოთხ ძირითად საფეხურს მოიცავს:

- ინფორმაციის შეგროვება
- შესრულების ანალიზი
- ცვლილებების მართვა
- რეპორტის მომზადება

18.1 რა ინფორმაცია არის საჭირო მონიტორინგის და კონტროლისთვის?

განრიგთან დაკავშირებული:

- აღნიშნეთ რომ თითოეული დასრულებული ღონისძიებას განრიგში მითითებული ჰქონდა დაწყების და დასრულების დრო

- აღნიშნეთ, რომ თითოეული დასრულებული ღონისძიება დაიწყო და დასრულდა
- თითოეული მიმდინარე ღონისძიების დაწყების დაგეგმილი თარიღი
- თითოეული მიმდინარე ღონისძიების დაწყების ფაქტობრივი თარიღი
- თითოეული მიმდინარე ღონისძიების დაგეგმილი დასრულების თარიღი
- თითოეული მიმდინარე ღონისძიების მიახლოებითი დასრულების თარიღი
- თითოეული მიმდინარე ღონისძიების პროგრესის აღწერა

ხარჯებთან დაკავშირებული:

- ყველა ღონისძიებისთვის გათვალისწინებული ხარჯების გაანგარიშება
- თითოეულ დასრულებულ ღონისძიებისთვის საჭIრო ფაქტობრივი ხარჯები
- თითოეულ მიმდინარე ღონისძიებაზე ფაქტობრივად დახარჯული თანხა
- თითოეული მიმდინარე ღონისძიებისათვის საჭირო დაგეგმილი თანხა

ფუნქციონალურობასთან დაკავშირებული:

- საბოლოო შედეგების შესაძლებლობის თავდაპირველი შეფასება
- საბოლოო შედეგების შესაძლებლობის ფაქტობრივი შეფასება

ხარისხთან დაკავშირებული:

- საბოლოო შედეგის ეფექტურობის თავდაპირველი შეფასება
- საბოლოო შედეგის ეფექტურობის ფაქტობრივი შეფასება

18.2 ინფორმაციის შეგროვების გზები

- შეხვედრები
- სხვადასხვა ფორმების და ნიმუშების შევსების დანერგვა
- მენეჯმენტი "ოთახებში სიარული-ს" გზით
- კომპიუტერული პროგრამები (მაგ; Microsoft Project)

18.3 კითხვები, რომელებიც უნდა დაისვას შეხვედრების დროს

დროებითი შედეგები:

- რა საფეხურებია უკვე დასრულებული?
- წარმატების რომელ ინდიკატორებს უკვე მიღწეული?

მოულოდნელი ცვლილებები:

- შეიცვალა თუ არა მნიშვნელოვანი მოსაზრებები? თუ კი, როგორ და რატომ?
- მნიშვნელოვანი მოსაზრებების შესაბამისად, რა მოდიფიკაციები შევიდა გეგმაში?

განხორციელების დროს წარმოქმნილი პრობლემები:

- ჩავარდა თუ არა რომელიმე დავალების შესრულება? თუ კი, რატომ? რა გაკეთდა მიმდინარე სამუშაოს დასრულებისთვის?
- არის თუ არა საკითხი, რომლებიც გადაუჭრელი რჩება? რა კეთდება მსგავსი საკითხების გადასაჭრელად?
- მოსალოდნელია თუ არა რაიმე პრობლემები სამომავლოდ? როგორია მათი მოგვარების გზები?
- აქვს თუ არა პროექტს რაიმე მოულოდნელი შედეგი? თუ კი, რა უნდა გაკეთდეს მდგომარეობის გამოსასწორებლად?

18.4 მონიტორინგის იარაღი – მონიტორინგის მატრიცა (მოვალეობების მატრიცა)

ღონისძიება	პასუხისმგებელი პირი	დაწყების თარიღი		დასრულების თარიღი		შენიშვნები
		დაგეგმილი	ფაქტობრივი	დაგეგმილი	ფაქტობრივი	
ღონისძიება 1						
ღონისძიება 2						
ღონისძიება 3						
ღონისძიება 4						

18.5 მონიტორინგის იარაღი – ცხრილი (განტის პროგრესის დიაგრამა)

ღ ო ნ ი ს ძ ი ე ბ ა	თარიღი							
		იანვარი	თებერვალი	მარტი	აპრილი	მაისი	ივნისი	ივლისი
	ღონისძიება 1							
	ღონისძიება 2							
	ღონისძიება 3							
	ღონისძიება 4							

19 რეპორტი

რეპორტის გაკეთება საჭიროა იმისთვის, რომ დაინტერებულ მხარეებს ჰქონდეთ ინფორმაციის დროულად მიღების საშუალება. ინფორმაციის განაწილება მოიცავს როგორც კომუნიკაციის მენეჯმენტის გეგმის განხორციელებას, ასევე ინფორმაციის მიწოდების მოულოდნელ მოთხოვნაზე რეაგირებას. ზოგადად, რეპორტი მოიცავს ინფორმაციას შინაარსის, განრიგის, ხარჯების და ხარისხობრივი მაჩვენებლების შესახებ. ბევრი პროექტი ასევე მოითხოვს ინფორმაციას რისკების და შესყიდვების შესახებ. რეპორტები შეიძლება მომზადდეს ჩვეულებრივ რეჟიმში ან გამონაკლის შემთხვევებში.

19.1 რეპორტების ტიპები:

- საგანგებო რეპორტი
- პროგრესის რეპორტი
- თხრობითი რეპორტი
- ფინანსური რეპორტი
- შედეგების რეპორტი
- ხარჯების რეპორტი
- განრიგის რეპორტი
- ფინალური რეპორტი
- შეფასების რეპორტი

პროგრესის რეპორტში

- განხილულია რა მოხდა მუშაობის დროს
- აღწერილია პრობლემებს და შესაბამისი კორექციული ღონისძიებები
- განხილულია სამომავლო გეგმები

პროგრესის რეპორტის შინაარსი

- წარმატებული მუშაობის მაჩვენებლები
- მუშაობის პროცესის ამსახველი დეტალები
- პრობლემები
- დამტკიცებული ცვლილებები
- რისკის მენეჯმენტის სტატუსი
- გეგმები შემდეგი პერიოდისთვის

პროგრესის რეპორტის რჩევები

- მოარგეთ რეპორტი აუდიტორიას
- ჯერ მოამზადეთ ყველაზე დეტალური რეპორტი
- მოამზადეთ რეპორტი ყოველთვიურად
- ყოველთვის შეადარეთ პროექტის დაგეგმილი განვითარება ფაქტობრივს
- რეპორტში არ ჩართოთ სიურპრიზები

რას უნდა მოიცავდეს ფინალური რეპორტი

- მუშაობის შედეგების ინდიკატორები

- რესურსების უტილიზაციის (გამოყენების) სტატუსი
- ძლიერი და სუსტი მხარეები
- წარმატების განმაპირობებელი ფაქტორები

20 პროექტის დასრულება და შეფასება

<u>პროექტის დასრულება</u>

- დაასრულეთ ყველა ძირითადი საქმიანობა
- აღასრულეთ საჭირო ადმინისტრაციული დავალებები
- გამოცხადეთ პროექტის დასრულება
- მომაზადეთ ფინალური რეპორტი

20.1 რჩევები პროექტის დასრულებისთვის:

- გაითვალისწინეთ პროექტის დასრულებისთვის საჭირო ღონისძიებები პროექტის გეგმის შემუშავებისას
- ჩართეთ პროექტის დასრულება პროექტის გეგმაში ღონისძიების სახით

20.2 პროექტის დასრულების გამოცხადების მნიშვნელობა:

- დაინტერესებული მხარეებისთვის ინფორმაციის ინფორმაციის მიწოდება იმის შესახებ, რომ პროექტის შედეგების გაცნობა უკვე შესაძლებელია
- პროექტის დროებითი თანამშრომლებისა და სხვა მხარდამჭერების ინფორმირება იმის შესახებ, რომ მათმა ძალისხმევამ წარმატებული შედეგი გამოიღო

პროექტის შეფასების შემდგომ
პროექტები საუკეთესო საშუალებაა გამოცდილებისა და ცოდნის შესაძლენად. თქვენი პროექტის მონიტორინგი გაძლევთ მოვლენების ჩანაწერის გაკეთების საშუალებას. ასე რომ, თქვენ ყოველთვის უნდა ეძიოთ თუ რატომ და როგორ განვითარდა (პოზიტიურად თუ ნეგატიურად) მოვლენები.

შეფასება არის სწავლის საშუალებადა არა სხვების დადანაშაულების პროცესი მოვლენების ცუდად განვითარების გამო!

პროექტის შეფასება პროექტის დასრულების შემდეგ ხდება. ხანგრძლივი (მრავლწლიანი) პროექტების შემთხვევაში კი, ყოველი მნიშვნელოვანი ფაზის შემდეგ.

20.3 პროექტის დიზაინის შეფასება

პროექტის გუნდთან ერთად ყურადღებით შეამოწმეთ თუ რამდენად ზუსტი იყო ლოგიკური ჩარჩო და მოქმედების გეგმა. გაითვალისწინეთ შემდეგი კითხვები:

- პროექტის რელევანტურობა – ეხებოდა თუ არა პროექტი რეალურ მოთხოვნებს?
- წარატების საფეხური/კოეფიციენტი – მიაღწია თუ არა პროექტმა დასახულ მიზნებს და შედეგებს?
- რესურსების ეფექტურად გამოყენება – რამდენად სწორედ განსაზღვრა და გამოიყენა გუნდმა პროექტის ადამიანური რესურსები, მასალები და ფინანსები? რამდენად ზუსტი იყო მოქმედების გეგმა? მოვლენები ისე განვითარდა როგორც იყო დაგეგმილი იყო თუ სხვაგვარად?
- პროექტის მდგრადობა – რა ხანგრძლივი ეფექტი მოიტანა პროექტმა? შედეგის შენარჩუნებისთვის რა შემდგომი ღონისძიებებია საჭირო?

20.4 პროექტის შედეგების შეფასება

შედეგების დეტალური ანალიზი მოიცავს:

- ორი ან მეტი მიღწევის დასახელება შემდეგ სფეროებში:
  - პროექტის უნარი სასურველი შედეგების მისაღებად
  - გარემოზე, თემზე ან სამიზნე ჯგუფზე დადებითი გავლენის მოხდენა
  - სხვებთან პარტნიორობა და კოოპერაცია
  - პროექტის და გუნდური მუშაობის მენეჯმენტი
  - თითოეული წარმატებისთვის ინდიკატორის განსაზღვრა ისე რომ რეალური ფორმულირება მიეცეს
- იმის ფორმულირება თუ რომელი წარმატება დაგვეხმარა შედეგის მიღწევამდე
- თითოეული მიღწევიდან სულ მცირე ერთი შედეგის ფორმულირება
- მომავალი პროექტების და ღონისძიებებისთვის რეკომენდაციების გაკეთება
- შედეგების მდგრადობის შეფასება და შემდგომი მოქმედების მოაზრება და გადაცემა

20.5 იმის განსაზღვრა, თუ რა ვისწავლეთ

დროთა განმავლობაში ის გამოცდილება, რომელიც პროექტმა მოიტანა შეიძლება დაიკარგოს თუ არ მოხდა მისი დოკუმენტირება. როდესაც განისაზღვრება თუ რა ისწავლეთ პროექტის შედეგად, დაუსვით თქვენს თავს შემდეგი კითხვები:

- რა დაგამახსოვრდებათ პროექტიდან?
- რას მოიმოქმედებდით სხვანაირად მსგავსი პროექტის განხორციელება რომ მოგიხდეთ მომავალში?

როგორც წესი, კითხეთ პროექტის გუნდის წევრებს თუ რა გაკეთდა კარგად პროექტის მიდინარეობის დროს და რას ისურვებდნენ რომ სხვანაირად გაკეთებულიყო. პროექტის გუნდის წევრები წაახალისეთ აღნიშნონ სად შეეძლოთ გაუმჯობესება და როგორ. ასევე შეაფასეთ რამდენად ზუსტად განსაზღვრავდით საჭიროებას პროექტისთვის.

21 გამოყენებული ლიტერატურა

პროექტის მენეჯმენტის ინსტიტუტი (2003). *პროექტის მენეჯმენტის გზამკვლევი*, მესამე გამოცემა. (Project Management Institute (2003). A *Guide To The Project Management Body Of Knowledge*, 3rd ed., Project Management Institute. ISBN 193069945X.)

ჯეკ მერედიტი, შამუელ მანტელი (2002). *პროექტის მენეჯმენტი: მენეჯერული მიდგომა,* მეხუთე გამოცემა. (Jack R. Meredith, Samuel J. Mantel (2002). *Project Management: A Managerial Approach,* 5th ed., Wiley. ISBN 0471073237).

ჯეიმზ ლუისი (2002). *პროექტის მენეჯმენტის საფუძვლები*, მეორე გამოცემა. (Lewis, James (2002). *Fundamentals of Project Management*, 2nd ed., American Management Association. ISBN 0814471323).

სკოტ ბერკანი (2005). *პროექტის მენეჯმენტის ხელოვნება.* (Scott Berkun (2005). *Art of Project Management*, Cambridge, MA: O'Reilly Media. ISBN 0596007868).

ჰარი ჰეერკენსი (2001). *პროექტის მენეჯმენტი.* (Heerkens, Gary (2001). *Project Management (The Briefcase Book Series)*, McGraw-Hill. ISBN 0071379525).

ალან ლაუტონი (1998). *ეთიკური მენეჯმენტი საზოგადოებრივი სამსახურებისათვის.* (Alan Lawton (1998). *Ethical Management for the Public Services (Managing the Public Services*, Open University Press, ISBN 0335199194).

ჯეიმზ გარნეტი, დუაიტ უალდო (1994). *კომუნიკაცია მთავრობაში შედეგების მისაღებად: სტრატეგიული მიდგომა მენეჯერებისთვის.* (James L. Garnett, Dwight Waldo (1994). *Communicating for Results in Government: A Strategic Approach for Public Managers*, Jossey-Bass, ISBN: 0787900001).

სტივენ კოენი, უილიამ ეიმიკი (2002). *ეფექტური საჯარო მენეჯერი*, მესამე გამოცემა. (Steven Cohen, William Eimicke (2002). *The Effective Public Manager*, 3rd ed., Jossey-Bass ISBN: 0787959383).

22. გამოყენებული ინტერნეტ-რესურსები:

http://en.wikipedia.org/wiki/Project_Management

საჭირო ინფორმაცია და ბმულები

http://www.pmi.org/info/default.asp

პროექტის მენეჯმენტის ინსტიტუტის ვებ-გვერდი იძლევა გამოცდილი მენეჯერისთვის საჭირო უნარების აღწერას. ასევე, არის ელექტრონული ნიმუშებისა და სახელმძღვანელოების დიდ კოლექცია http://www.pmibookstore.org

http://www.managers-gestionnaires.gc.ca/reading_room/menu_e.shtml

კანადური ვებ-გვერდი საჯარო მენეჯერებისათვის, საინტერესო წიგნების, სტატიების და პრეზენტაციების ბიბლიოთეკა.

http://www.unido.org/doc/6397

პუბლიკაციები გაეროს ინდუსტრიული დანვითარების ორგანიზაციის პუბლიკაციები, რომლების გამოსადეგია სამოქალაქო სექტორის თანამშრომლებისათვის.

http://www.ogc.gov.uk

დიდი ბრიტანეთის სახელმწიფო კომერციის ორგანიზაცია. ინფორმაცია შესყიდვების პროცესისა და საზოგადოებრივი პროექტების შესახებ.

http://www.laatuk.com/resources.htm

პროექტის მენეჯმენტთან დაკავშირებული ვებ-გვერდების ჩამონათვალი.

http://europa.eu.int/comm/europeaid/qsm/project_en.htm

ევროკომისიის ვებ-გვერდი პროექტისა და პროგრამის დაგეგმვისათვის. ძალიან გამოსადეგი ინფორმაცია დიდი პროექტებისა და პროგრამების შესახებ.
